ID	Nome attività	Inizio progr.	Fine progr.	Durata	Inizio eff.	Fine eff.
1	**Lotto I stato 3**	**gio 15/02/01**	**mar 23/10/01**	**358 g**	**gio 15/02/01**	
1	**Area 1A 1B**	**gio 15/02/01**	**sab 26/05/01**	**243 g**	**gio 15/02/01**	**lun 15/10/01**
2	Impianto cantiere (A)	gio 15/02/01	sab 17/02/01	3 g	gio 15/02/01	sab 17/02/01
3	Impianto cantiere (B)	gio 15/02/01	sab 17/02/01	3 g	gio 15/02/01	sab 17/02/01
4	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A)	dom 18/02/01	lun 19/02/01	2 g	dom 18/02/01	lun 19/02/01
5	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (B)	dom 18/02/01	lun 19/02/01	2 g	dom 18/02/01	lun 19/02/01
6	Opere di scavo (B)	mar 20/02/01	gio 22/03/01	31 g	mer 06/06/01	ven 06/07/01
7	Opere di fondazione speciale (A)	mar 20/02/01	mer 28/02/01	9 g	dom 22/07/01	lun 30/07/01
8	Opere di fondazione speciale (B)	ven 23/02/01	dom 25/03/01	31 g	ven 22/06/01	dom 22/07/01
9	Opere di montaggio barriere pm	mar 27/02/01	mar 06/03/01	8 g	dom 24/06/01	dom 01/07/01
10	Opere in ca per strutture in elevato	gio 08/03/01	ven 06/04/01	26 g	gio 05/07/01	lun 30/07/01
11	Opere in ca per strutture in elevato	mer 21/03/01	ven 20/04/01	31 g	mer 18/07/01	ven 17/08/01
12	opere in muratura	sab 21/04/01	dom 06/05/01	16 g	sab 18/08/01	dom 02/09/01
13	Opere di sistemazione e regimazione acque	lun 07/05/01	mer 16/05/01	10 g	lun 03/09/01	mer 12/09/01
14	Opere di ripristino pavimentazione stradale	gio 17/05/01	lun 21/05/01	5 g	gio 13/09/01	lun 17/09/01
15	Rimozione cantiere	mar 22/05/01	sab 26/05/01	5 g	gio 11/10/01	lun 15/10/01
16	**Area 2/3B**	**gio 15/02/01**	**lun 04/06/01**	**113 g**	**lun 30/07/01**	
17	Impianto di cantiere	gio 15/02/01	sab 17/02/01	3 g	lun 30/07/01	mer 01/08/01
18	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	dom 18/02/01	gio 22/02/01	5 g	gio 02/08/01	lun 06/08/01
19	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste	sab 10/03/01	sab 28/04/01	50 g	lun 01/10/01	
20	Opere di fondazione speciale per barriere pm	ven 23/02/01	ven 09/03/01	15 g	mar 07/08/01	mar 21/08/01
21	Fornitura e posa barriere pm	lun 05/03/01	lun 19/03/01	15 g	mar 09/10/01	
22	Fornitura e posa di reti	mar 07/08/01	gio 16/08/01	10 g	mar 09/10/01	
23	Opere di fondazione in ca	dom 25/03/01	ven 13/04/01	20 g	mer 22/08/01	lun 10/09/01
24	Opere di sostegno in ca e muratura in elevato	lun 09/04/01	mer 09/05/01	31 g	ven 28/09/01	
25	Ripristino pavimentazione stradale	dom 20/05/01	mar 29/05/01	10 g	lun 29/10/01	
26	Ripristini acque superficiali di versante	gio 10/05/01	sab 19/05/01	10 g	lun 29/10/01	
27	Rimozione cantiere	mer 30/05/01	lun 04/06/01	6 g	NA	
28	**Area 4A**	**gio 15/02/01**	**mar 23/10/01**	**358 g**	**gio 15/02/01**	
29	Impianto cantiere	gio 15/02/01	sab 17/02/01	3 g	gio 15/02/01	sab 17/02/01
30	Tagli e disgaggi	dom 18/02/01	ven 23/02/01	6 g	dom 18/02/01	ven 23/02/01
31	Fondazioni speciali per barriere pm	sab 24/02/01	mer 21/03/01	26 g	sab 24/02/01	mer 21/03/01
32	Fornitura e posa barriere pm	ven 16/03/01	dom 15/04/01	31 g	sab 30/06/01	lun 30/07/01
33	Opere di scavo e demolizione	lun 16/04/01	ven 15/06/01	61 g	mar 31/07/01	sab 29/09/01
34	Opere di ca e muratura elevato	sab 16/06/01	ven 24/08/01	70 g	lun 01/10/01	
35	Fornitura e posa reti	sab 25/08/01	lun 03/09/01	10 g		
36	Regimazione acque e rinverdimento	sab 25/08/01	mar 02/10/01	39 g		
37	Ripristino pavimentazione stradale	mer 03/10/01	mar 16/10/01	14 g		
38	Rimozione cantiere	mer 17/10/01	mar 23/10/01	7 g		
2	**Lotto II stato 3**	**gio 15/02/01**	**lun 22/10/01**	**250 g**	**gio 15/02/01**	
1	**Area 5**	**ven 30/03/01**	**gio 31/05/01**	**114 g**	**mar 01/05/01**	
2	Impianto di cantiere	ven 30/03/01	dom 01/04/01	3 g	mar 01/05/01	gio 03/05/01
3	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	lun 02/04/01	lun 09/04/01	8 g	ven 04/05/01	ven 11/05/01
4	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste	mar 10/04/01	dom 15/04/01	6 g	sab 12/05/01	gio 17/05/01
5	Opere di fondazione speciale per barriere pm	mar 08/05/01	gio 17/05/01	10 g	sab 09/06/01	lun 18/06/01
6	Opere in legname	lun 16/04/01	mer 25/04/01	10 g	lun 30/07/01	mer 08/08/01
7	Fornitura e montagio barriere pm	mer 16/05/01	ven 25/05/01	10 g	lun 30/07/01	mer 08/08/01
8	Gradonate etc.	gio 26/04/01	gio 10/05/01	15 g	ven 20/07/01	ven 03/08/01
9	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	sab 26/05/01	lun 28/05/01	3 g	ven 20/07/01	dom 22/07/01
10	Rimozione cantiere	mar 29/05/01	gio 31/05/01	3 g	lun 20/08/01	mer 22/08/01
11	**Area 6-A**	**ven 30/03/01**	**ven 18/05/01**	**67 g**	**dom 27/05/01**	**mer 01/08/01**
12	Impianto di cantiere	ven 30/03/01	dom 01/04/01	3 g	dom 27/05/01	mar 29/05/01

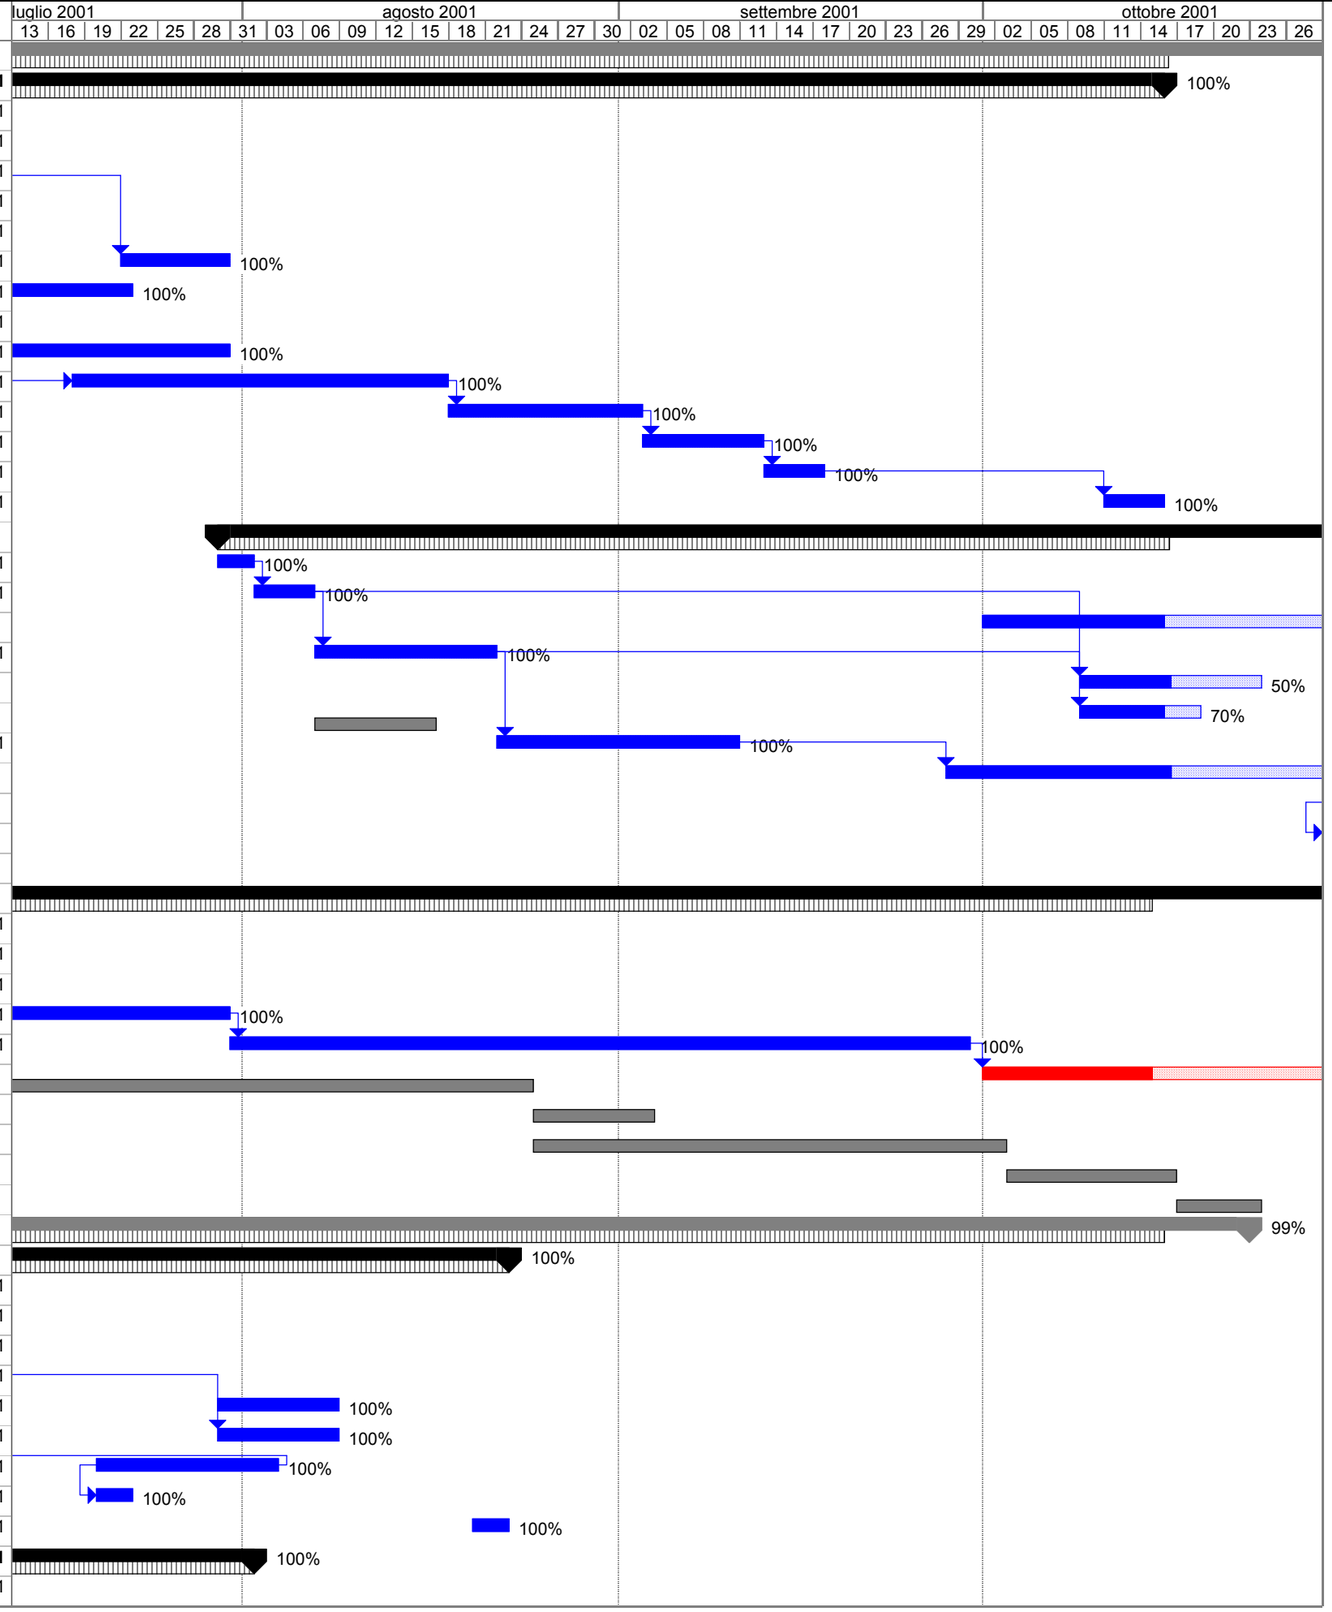

Progetto Complessivo - Dettaglio
Controllo al 15.X.2001
Data: ven. 19.10.2001

Critica	Divisione	Cardine previsto	Riepilogo progetto
Divisione critica	Avanzamento attività	Cardine	Attività esterne
Avanzamento critica	Previsto	Avanzamento riepilogo	Cardine esterno
Attività	Divisione prevista	Riepilogo	Scadenza

ID	Nome attività	Inizio progr.	Fine progr.	Durata	Inizio eff.	Fine eff.
13	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	lun 02/04/01	mer 04/04/01	3 g	mer 30/05/01	ven 01/06/01
14	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste	sab 14/04/01	mer 18/04/01	5 g	lun 11/06/01	ven 15/06/01
15	Reti e chiodature	gio 05/04/01	ven 13/04/01	9 g	sab 02/06/01	dom 10/06/01
16	Opere di fondazione in ca	gio 19/04/01	sab 28/04/01	10 g	sab 16/06/01	lun 25/06/01
17	Opere in muratura	dom 29/04/01	gio 10/05/01	34 g	mar 26/06/01	dom 29/07/01
18	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	ven 11/05/01	mar 15/05/01	5 g	dom 08/07/01	gio 12/07/01
19	Rimozione cantiere	mer 16/05/01	ven 18/05/01	3 g	lun 30/07/01	mer 01/08/01
20	**Area 6-B**	**ven 06/04/01**	**dom 24/06/01**	**80 g**	**sab 12/05/01**	**lun 30/07/01**
21	Impianto di cantiere	ven 06/04/01	dom 08/04/01	3 g	sab 12/05/01	lun 14/05/01
22	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	lun 09/04/01	lun 23/04/01	15 g	mar 15/05/01	mar 29/05/01
23	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste	mar 24/04/01	gio 03/05/01	10 g	mer 30/05/01	ven 08/06/01
24	Opere di fondazione speciale per barriere pm	lun 14/05/01	lun 28/05/01	15 g	mar 19/06/01	mar 03/07/01
25	Reti a contatto	lun 11/06/01	mer 20/06/01	10 g	mar 17/07/01	gio 26/07/01
26	Opere di montaggio barriere pm	dom 27/05/01	dom 10/06/01	15 g	lun 02/07/01	lun 16/07/01
27	Opere di sostegno in legname	dom 29/04/01	mer 23/05/01	25 g	lun 04/06/01	gio 28/06/01
28	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	lun 18/06/01	gio 21/06/01	4 g	mar 24/07/01	ven 27/07/01
29	Rimozione cantiere	ven 22/06/01	dom 24/06/01	3 g	sab 28/07/01	lun 30/07/01
30	**Area 6-C**	**ven 06/04/01**	**dom 27/05/01**	**83 g**	**sab 09/06/01**	**gio 30/08/01**
31	Impianto di cantiere	ven 06/04/01	dom 08/04/01	3 g	sab 09/06/01	lun 11/06/01
32	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	lun 09/04/01	mer 11/04/01	3 g	mar 12/06/01	gio 14/06/01
33	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste	sab 28/04/01	mar 01/05/01	4 g	dom 01/07/01	mer 04/07/01
34	Opere di fondazione speciale per barriere pm	gio 12/04/01	sab 21/04/01	10 g	ven 15/06/01	dom 24/06/01
35	Opere di montaggio barriere pm	ven 20/04/01	dom 29/04/01	10 g	sab 23/06/01	lun 02/07/01
36	Opere di fondazione in ca	lun 30/04/01	lun 07/05/01	8 g	mer 01/08/01	mer 08/08/01
37	Opere in muratura	mar 08/05/01	mar 22/05/01	15 g	sab 11/08/01	sab 25/08/01
38	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	lun 21/05/01	gio 24/05/01	4 g	ven 24/08/01	lun 27/08/01
39	Rimozione cantiere	ven 25/05/01	dom 27/05/01	3 g	mar 28/08/01	gio 30/08/01
40	**Area 6-D**	**sab 26/05/01**	**sab 21/07/01**	**77 g**	**dom 15/07/01**	**sab 29/09/01**
41	Impianto di cantiere	sab 26/05/01	lun 28/05/01	3 g	dom 15/07/01	mar 17/07/01
42	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	mar 29/05/01	mar 29/05/01	1 g	mer 18/07/01	mer 18/07/01
43	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste	mer 30/05/01	sab 02/06/01	4 g	gio 19/07/01	dom 22/07/01
44	Opere di fondazione in ca	dom 03/06/01	dom 17/06/01	15 g	sab 11/08/01	sab 25/08/01
45	Opere in muratura	lun 18/06/01	mar 17/07/01	30 g	dom 26/08/01	lun 24/09/01
46	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	sab 14/07/01	mer 18/07/01	5 g	dom 02/09/01	gio 06/09/01
47	Rimozione cantiere	gio 19/07/01	sab 21/07/01	3 g	gio 27/09/01	sab 29/09/01
48	**Area 6-E**	**gio 15/02/01**	**mar 14/08/01**	**170 g**	**gio 15/02/01**	**ven 03/08/01**
49	Impianto di cantiere	gio 15/02/01	sab 17/02/01	3 g	gio 15/02/01	sab 17/02/01
50	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	dom 18/02/01	gio 29/03/01	40 g	dom 18/02/01	gio 29/03/01
51	Opere di montaggio barriere pm	gio 14/06/01	sab 11/08/01	59 g	gio 31/05/01	sab 28/07/01
52	Opere di fondazione speciale	sab 14/04/01	gio 12/07/01	90 g	sab 14/04/01	gio 12/07/01
53	Reti e chiodature	ven 30/03/01	ven 13/04/01	15 g	lun 16/07/01	lun 30/07/01
54	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	gio 02/08/01	sab 11/08/01	10 g	gio 19/07/01	sab 28/07/01
55	Rimozione cantiere	dom 12/08/01	mar 14/08/01	3 g	mer 01/08/01	ven 03/08/01
56	**Area 6-G**	**lun 13/08/01**	**gio 20/09/01**	**39 g**	**sab 01/09/01**	**mar 09/10/01**
57	Impianto di cantiere	lun 13/08/01	mer 15/08/01	3 g	sab 01/09/01	lun 03/09/01
58	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	gio 16/08/01	sab 18/08/01	3 g	mar 04/09/01	gio 06/09/01
59	Reti e chiodature	dom 19/08/01	dom 02/09/01	15 g	ven 07/09/01	ven 21/09/01
60	Rimozione cantiere	mar 18/09/01	gio 20/09/01	3 g	dom 07/10/01	mar 09/10/01
61	**Ripristino pavimentazione Aree 5 e 6**	**lun 10/09/01**	**lun 22/10/01**	**24 g**	**sab 29/09/01**	
62	Area 5	mar 16/10/01	sab 20/10/01	5 g		
63	Area 6-A	sab 20/10/01	lun 22/10/01	3 g		
64	Area 6-B	lun 10/09/01	mer 12/09/01	3 g	sab 29/09/01	lun 01/10/01

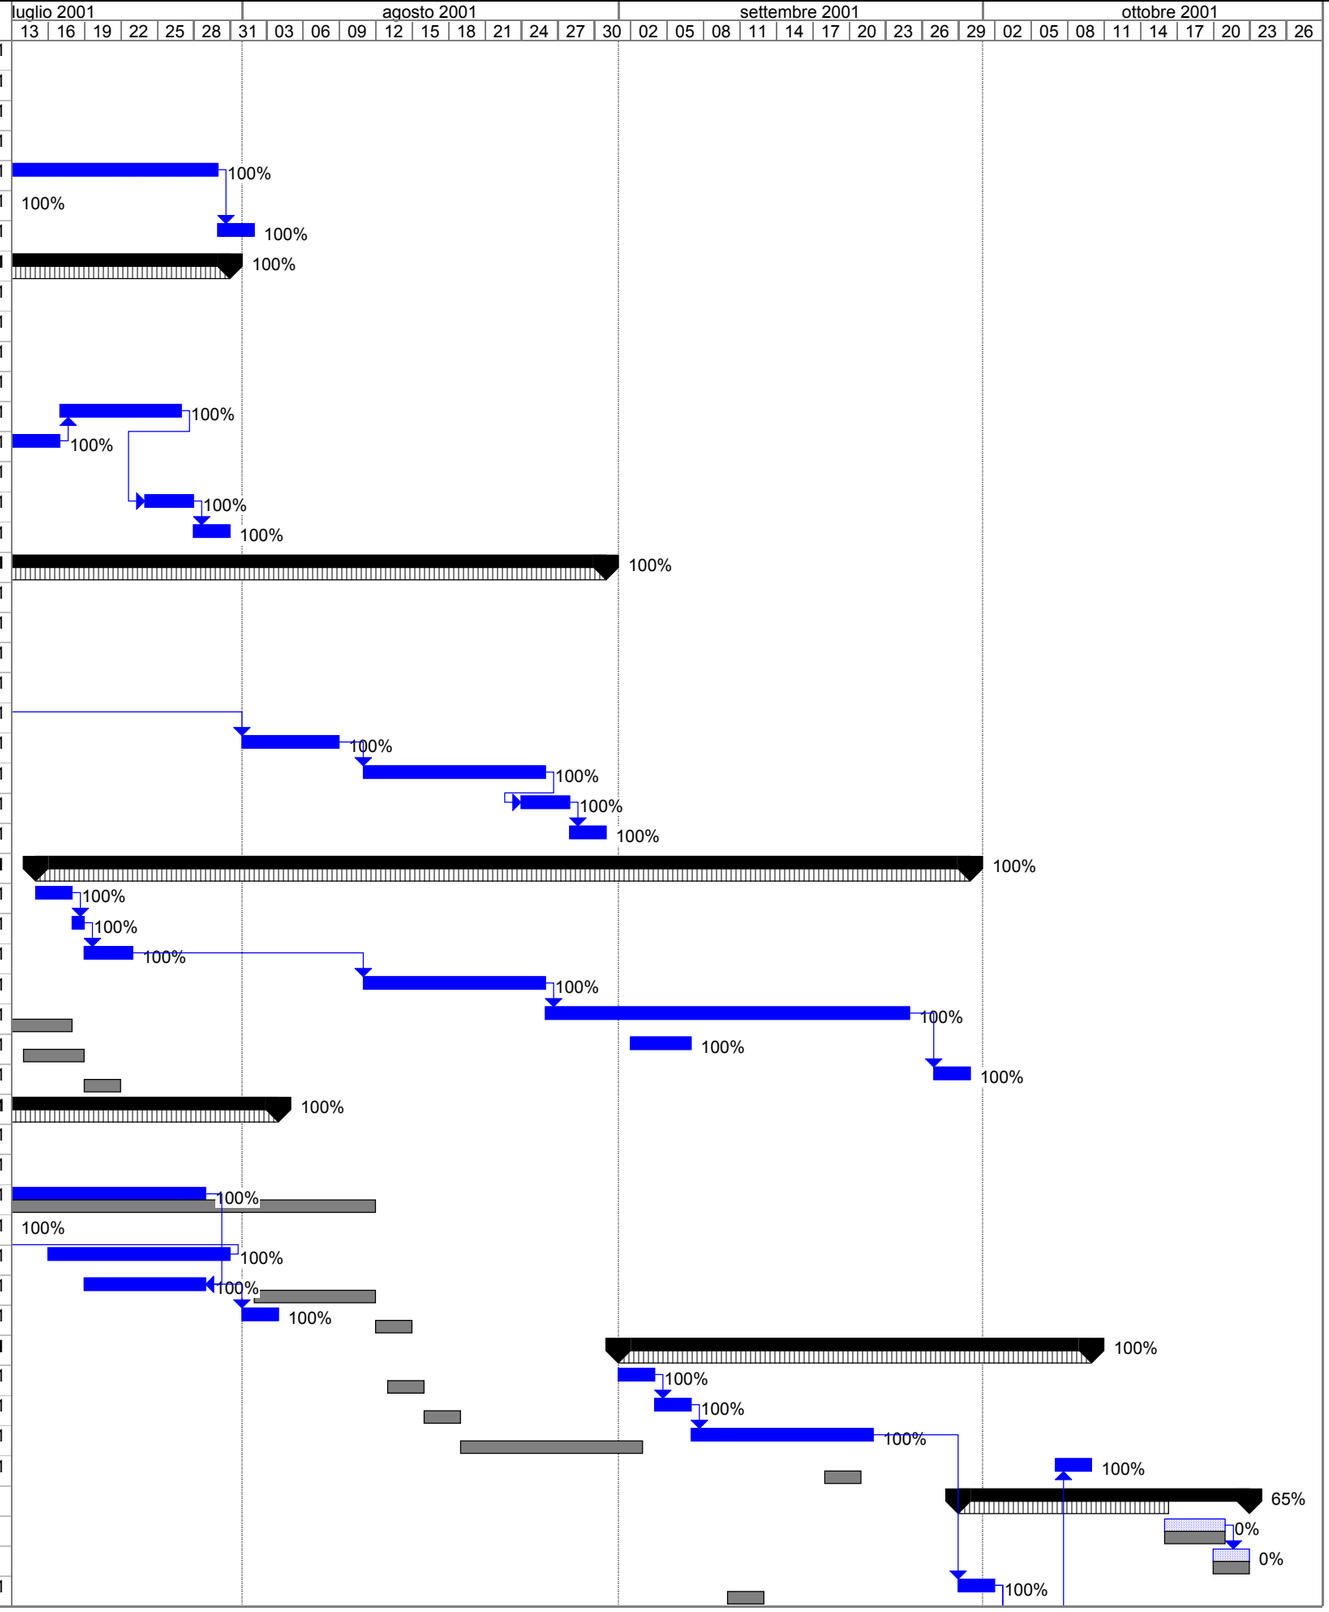

Progetto Complessivo - Dettaglio
Controllo al 15.X.2001
Data: ven. 19.10.2001

Critica	Divisione	Cardine previsto	Riepilogo progetto
Divisione critica	Avanzamento attività	Cardine	Attività esterne
Avanzamento critica	Previsto	Avanzamento riepilogo	Cardine esterno
Attività	Divisione prevista	Riepilogo	Scadenza

ID	Nome attività	Inizio progr.	Fine progr.	Durata	Inizio eff.	Fine eff.
65	Area 6-C	gio 13/09/01	sab 15/09/01	3 g	mar 02/10/01	gio 04/10/01
66	Area 6-D	gio 13/09/01	sab 15/09/01	3 g	mar 02/10/01	gio 04/10/01
67	Area 6-E	sab 15/09/01	lun 17/09/01	3 g	gio 04/10/01	sab 06/10/01
68	Area 6-G	lun 17/09/01	mer 19/09/01	3 g	sab 06/10/01	lun 08/10/01
3	**Lotto III stato 3**	**gio 15/02/01**	**gio 25/10/01**	**212 g**	**gio 05/04/01**	
1	**Area 7A**	**ven 27/04/01**	**mar 22/05/01**	**26 g**	**ven 27/04/01**	**mar 22/05/01**
2	Impianto di cantiere	ven 27/04/01	dom 29/04/01	3 g	ven 27/04/01	dom 29/04/01
3	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	lun 30/04/01	mer 02/05/01	3 g	lun 30/04/01	mer 02/05/01
4	Opere di scavo	gio 03/05/01	ven 04/05/01	2 g	gio 03/05/01	ven 04/05/01
5	Opere di fondazione speciale	gio 03/05/01	mer 09/05/01	7 g	gio 03/05/01	mer 09/05/01
6	Reti e chiodature	mar 15/05/01	lun 21/05/01	7 g	mar 15/05/01	lun 21/05/01
7	Opere di montaggio barriere pm	mar 08/05/01	lun 14/05/01	7 g	mar 08/05/01	lun 14/05/01
8	Rimozione cantiere	mar 22/05/01	mar 22/05/01	1 g	mar 22/05/01	mar 22/05/01
9	**Area 7B**	**mar 22/05/01**	**sab 09/06/01**	**19 g**	**mar 22/05/01**	**sab 09/06/01**
10	Impianto di cantiere	mar 22/05/01	mar 22/05/01	1 g	mar 22/05/01	mar 22/05/01
11	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	mer 23/05/01	mar 29/05/01	7 g	mer 23/05/01	mar 29/05/01
12	Opere di scavo	mer 30/05/01	gio 31/05/01	2 g	mer 30/05/01	gio 31/05/01
13	Opere di fondazione speciale	ven 01/06/01	mar 05/06/01	5 g	ven 01/06/01	mar 05/06/01
14	Opere di montaggio barriere pm	lun 04/06/01	ven 08/06/01	5 g	lun 04/06/01	ven 08/06/01
15	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	gio 07/06/01	ven 08/06/01	2 g	gio 07/06/01	ven 08/06/01
16	Rimozione cantiere	sab 09/06/01	sab 09/06/01	1 g	sab 09/06/01	sab 09/06/01
17	**Area 7C**	**sab 09/06/01**	**sab 30/06/01**	**22 g**	**lun 30/07/01**	**lun 20/08/01**
18	Impianto di cantiere	sab 09/06/01	sab 09/06/01	1 g	lun 30/07/01	lun 30/07/01
19	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	dom 10/06/01	gio 14/06/01	5 g	mar 31/07/01	sab 04/08/01
20	Reti e chiodature	ven 15/06/01	ven 29/06/01	15 g	dom 05/08/01	dom 19/08/01
21	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	ven 29/06/01	ven 29/06/01	1 g	dom 19/08/01	dom 19/08/01
22	Rimozione cantiere	sab 30/06/01	sab 30/06/01	1 g	lun 20/08/01	lun 20/08/01
23	**Ripristino pavimentazione stradale Aree 7A-B-C**	**lun 10/09/01**	**mer 12/09/01**	**3 g**		
24	Area 7A	mer 12/09/01	mer 12/09/01	1 g		
25	Area 7B	mar 11/09/01	mar 11/09/01	1 g		
26	Area 7C	lun 10/09/01	lun 10/09/01	1 g		
27	**Area 7G-H**	**gio 15/02/01**	**ven 27/04/01**	**72 g**	**gio 05/04/01**	**ven 15/06/01**
28	Impianto di cantiere	gio 15/02/01	sab 17/02/01	3 g	gio 05/04/01	**sab 07/04/01**
29	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	dom 18/02/01	sab 24/02/01	7 g	dom 08/04/01	sab 14/04/01
30	Opere di scavo	dom 25/02/01	mer 28/02/01	4 g	dom 15/04/01	mer 18/04/01
31	Opere di fondazione speciale (A)	mer 28/02/01	gio 29/03/01	30 g	mer 18/04/01	gio 17/05/01
32	Opere di montaggio barriere pm	mer 21/03/01	gio 19/04/01	30 g	mer 09/05/01	gio 07/06/01
33	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	mar 17/04/01	sab 21/04/01	5 g	mar 05/06/01	sab 09/06/01
34	Ripristino pavimentazione stradale	mer 25/04/01	ven 27/04/01	3 g	mer 13/06/01	ven 15/06/01
35	Rimozione cantiere	dom 22/04/01	gio 26/04/01	5 g	dom 10/06/01	gio 14/06/01
36	**Area 9P-Q**	**dom 01/04/01**	**gio 07/06/01**	**34 g**	**gio 05/07/01**	**mar 07/08/01**
37	Impianto di cantiere (A+B)	dom 01/04/01	gio 05/04/01	5 g	gio 05/07/01	lun 09/07/01
38	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A+B)	ven 06/04/01	dom 08/04/01	3 g	mar 10/07/01	gio 12/07/01
39	Opere di scavo (B)	mer 25/04/01	ven 04/05/01	10 g	dom 29/07/01	mar 07/08/01
40	Opere di fondazione speciale (A)	lun 09/04/01	mer 18/04/01	10 g	ven 13/07/01	dom 22/07/01
41	Reti e chiodature	ven 01/06/01	mar 05/06/01	5 g	dom 22/07/01	gio 26/07/01
42	Opere di montaggio barriere pm	mar 17/04/01	mer 25/04/01	9 g	sab 21/07/01	dom 29/07/01
43	Opere di fondazione in c.a.	ven 06/07/01	ven 20/07/01	15 g	ven 06/07/01	ven 20/07/01
44	Opere in legname	gio 24/05/01	gio 31/05/01	8 g	ven 06/07/01	ven 13/07/01
45	Opere in muratura	sab 12/05/01	gio 31/05/01	20 g	lun 09/07/01	sab 28/07/01
46	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	lun 28/05/01	dom 03/06/01	7 g	lun 30/07/01	dom 05/08/01
47	Rimozione cantiere	mer 06/06/01	gio 07/06/01	2 g	lun 06/08/01	mar 07/08/01

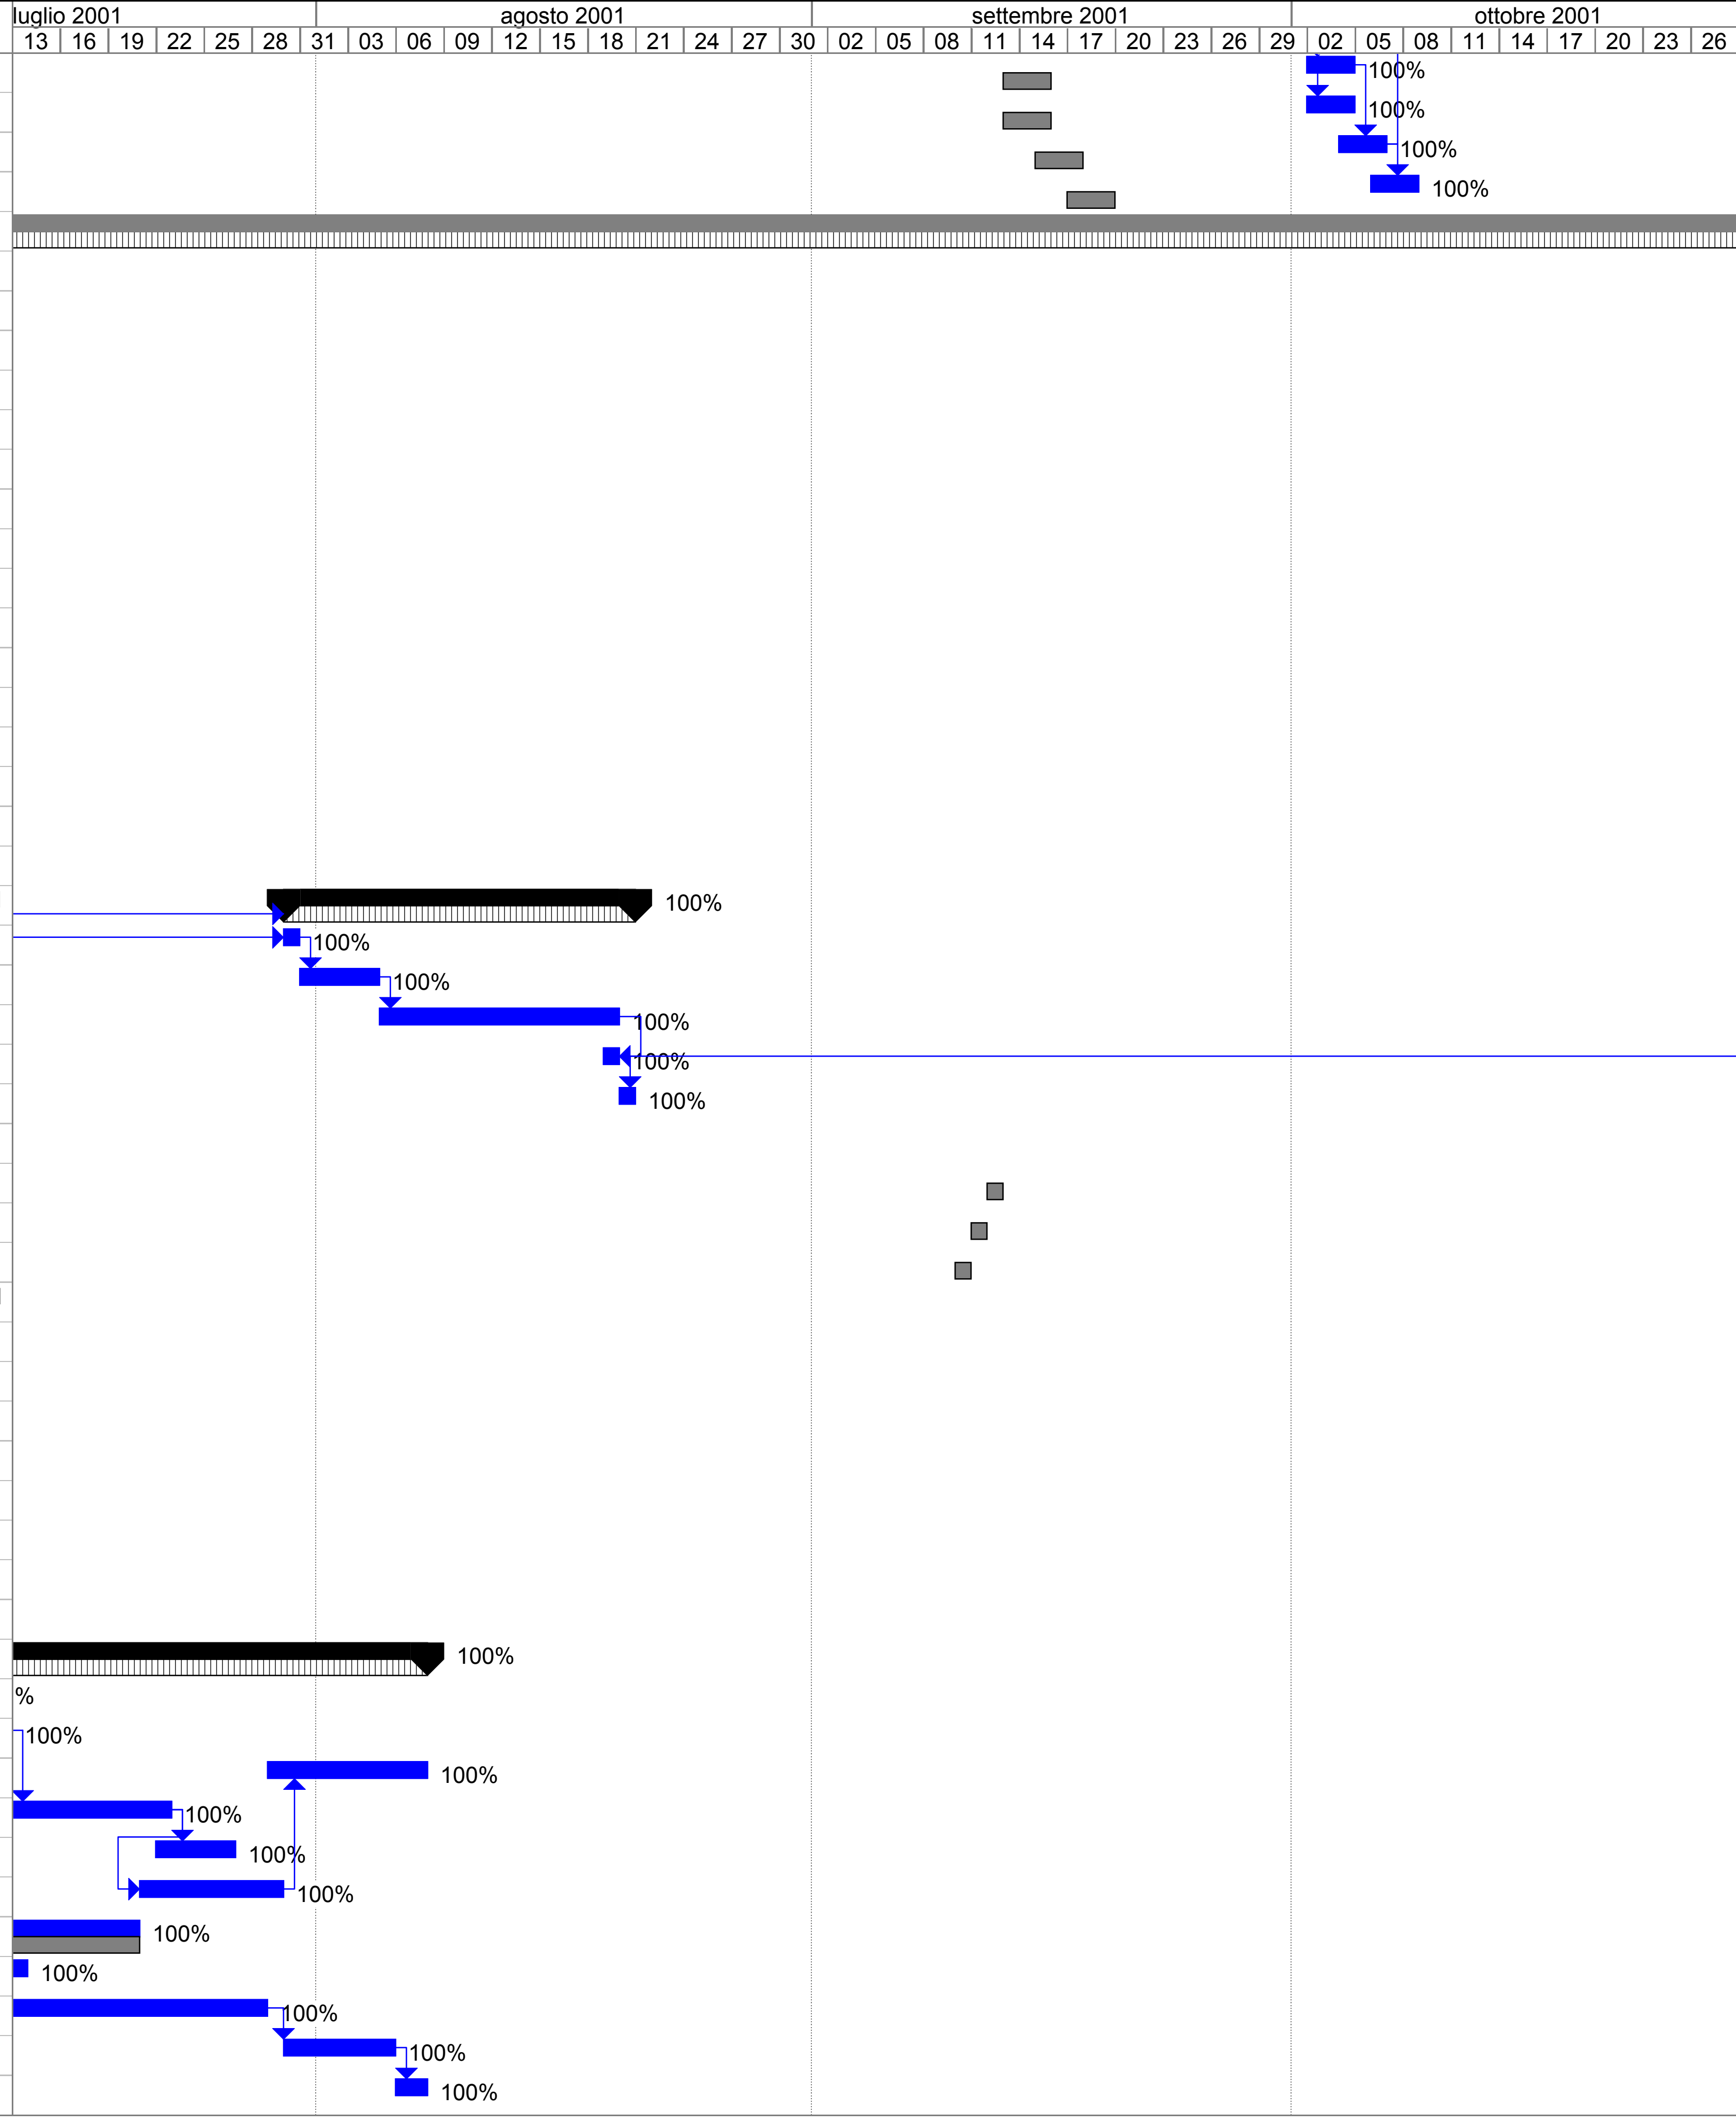

Progetto Complessivo - Dettaglio
Controllo al 15.X.2001
Data: ven. 19.10.2001

Critica		Divisione		Cardine previsto		Riepilogo progetto	
Divisione critica		Avanzamento attività		Cardine		Attività esterne	
Avanzamento critica		Previsto		Avanzamento riepilogo		Cardine esterno	
Attività		Divisione prevista		Riepilogo		Scadenza	

ID	Nome attività	Inizio progr.	Fine progr.	Durata	Inizio eff.	Fine eff.
48	**Area 9R**	**mer 06/06/01**	**gio 19/07/01**	**32 g**	**ven 06/07/01**	**lun 06/08/01**
49	Impianto di cantiere	ven 06/07/01	sab 07/07/01	2 g	ven 06/07/01	sab 07/07/01
50	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	ven 08/06/01	mar 12/06/01	5 g	ven 06/07/01	mar 10/07/01
51	Opere di scavo (B)	gio 28/06/01	sab 30/06/01	3 g	ven 06/07/01	dom 08/07/01
52	Opere di fondazione speciale (A)	mar 12/06/01	gio 21/06/01	10 g	dom 08/07/01	mar 17/07/01
53	Reti e chiodature	ven 13/07/01	mar 17/07/01	5 g	ven 20/07/01	mar 24/07/01
54	Opere di montaggio barriere pm	mer 20/06/01	mer 27/06/01	8 g	ven 20/07/01	ven 27/07/01
55	Opere in muratura	lun 16/07/01	lun 30/07/01	15 g	lun 16/07/01	lun 30/07/01
56	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	dom 08/07/01	gio 12/07/01	5 g	mar 31/07/01	sab 04/08/01
57	Rimozione cantiere	mer 18/07/01	gio 19/07/01	2 g	dom 05/08/01	lun 06/08/01
58	**Area 9S**	**gio 19/07/01**	**sab 01/09/01**	**45 g**	**ven 06/07/01**	**dom 19/08/01**
59	Impianto di cantiere	gio 19/07/01	ven 20/07/01	2 g	ven 06/07/01	sab 07/07/01
60	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	sab 21/07/01	mer 25/07/01	5 g	dom 08/07/01	gio 12/07/01
61	Opere di scavo	gio 09/08/01	sab 11/08/01	3 g	ven 27/07/01	dom 29/07/01
62	Opere di fondazione speciale	gio 26/07/01	sab 04/08/01	10 g	ven 13/07/01	dom 22/07/01
63	Reti e chiodature	ven 03/08/01	mer 08/08/01	6 g	sab 21/07/01	gio 26/07/01
64	Opere di fondazione in ca	dom 12/08/01	gio 16/08/01	5 g	lun 30/07/01	ven 03/08/01
65	Opere in muratura	ven 17/08/01	mar 28/08/01	12 g	sab 04/08/01	mer 15/08/01
66	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	lun 27/08/01	gio 30/08/01	4 g	mar 14/08/01	ven 17/08/01
67	Rimozione cantiere	ven 31/08/01	sab 01/09/01	2 g	sab 18/08/01	dom 19/08/01
68	**Area 9T**	**dom 02/09/01**	**dom 16/09/01**	**15 g**	**ven 06/07/01**	**ven 20/07/01**
69	Impianto di cantiere (A+B)	dom 02/09/01	lun 03/09/01	2 g	ven 06/07/01	sab 07/07/01
70	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A+B)	lun 03/09/01	mar 04/09/01	2 g	sab 07/07/01	dom 08/07/01
71	Reti e chiodature	mer 05/09/01	ven 14/09/01	10 g	lun 09/07/01	mer 18/07/01
72	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	sab 15/09/01	sab 15/09/01	1 g	gio 19/07/01	gio 19/07/01
73	Rimozione cantiere	dom 16/09/01	dom 16/09/01	1 g	ven 20/07/01	ven 20/07/01
74	**Area 9U**	**sab 15/09/01**	**sab 06/10/01**	**22 g**	**lun 20/08/01**	**lun 10/09/01**
75	Impianto di cantiere	sab 15/09/01	dom 16/09/01	2 g	lun 20/08/01	mar 21/08/01
76	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	lun 17/09/01	mer 19/09/01	3 g	mer 22/08/01	ven 24/08/01
77	Reti e chiodature	mar 25/09/01	gio 04/10/01	10 g	gio 30/08/01	sab 08/09/01
78	Opere di sistemazione e regimazione acque dei	gio 20/09/01	lun 24/09/01	5 g	sab 25/08/01	mer 29/08/01
79	Rimozione cantiere	ven 05/10/01	sab 06/10/01	2 g	dom 09/09/01	lun 10/09/01
80	**Area 9V**	**sab 06/10/01**	**gio 25/10/01**	**20 g**	**lun 20/08/01**	**sab 08/09/01**
81	Impianto di cantiere	sab 06/10/01	dom 07/10/01	2 g	lun 20/08/01	mar 21/08/01
82	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	lun 08/10/01	mer 10/10/01	3 g	mer 22/08/01	ven 24/08/01
83	Reti e chiodature	gio 11/10/01	sab 20/10/01	10 g	sab 25/08/01	lun 03/09/01
84	Rimozione cantiere	lun 22/10/01	gio 25/10/01	4 g	mer 05/09/01	sab 08/09/01
85	**Ripristino pavimentazione stradale Area 9**	**ven 19/10/01**	**lun 22/10/01**	**4 g**	**dom 02/09/01**	**mer 05/09/01**
86	Area 9P-Q	ven 19/10/01	ven 19/10/01	1 g	dom 02/09/01	dom 02/09/01
87	Area 9R	ven 19/10/01	ven 19/10/01	1 g	dom 02/09/01	dom 02/09/01
88	Area 9S	sab 20/10/01	sab 20/10/01	1 g	lun 03/09/01	lun 03/09/01
89	Area 9T	dom 21/10/01	dom 21/10/01	1 g	mar 04/09/01	mar 04/09/01
90	Area 9U	lun 22/10/01	lun 22/10/01	1 g	mer 05/09/01	mer 05/09/01
91	Area 9V	lun 22/10/01	lun 22/10/01	1 g	mer 05/09/01	mer 05/09/01

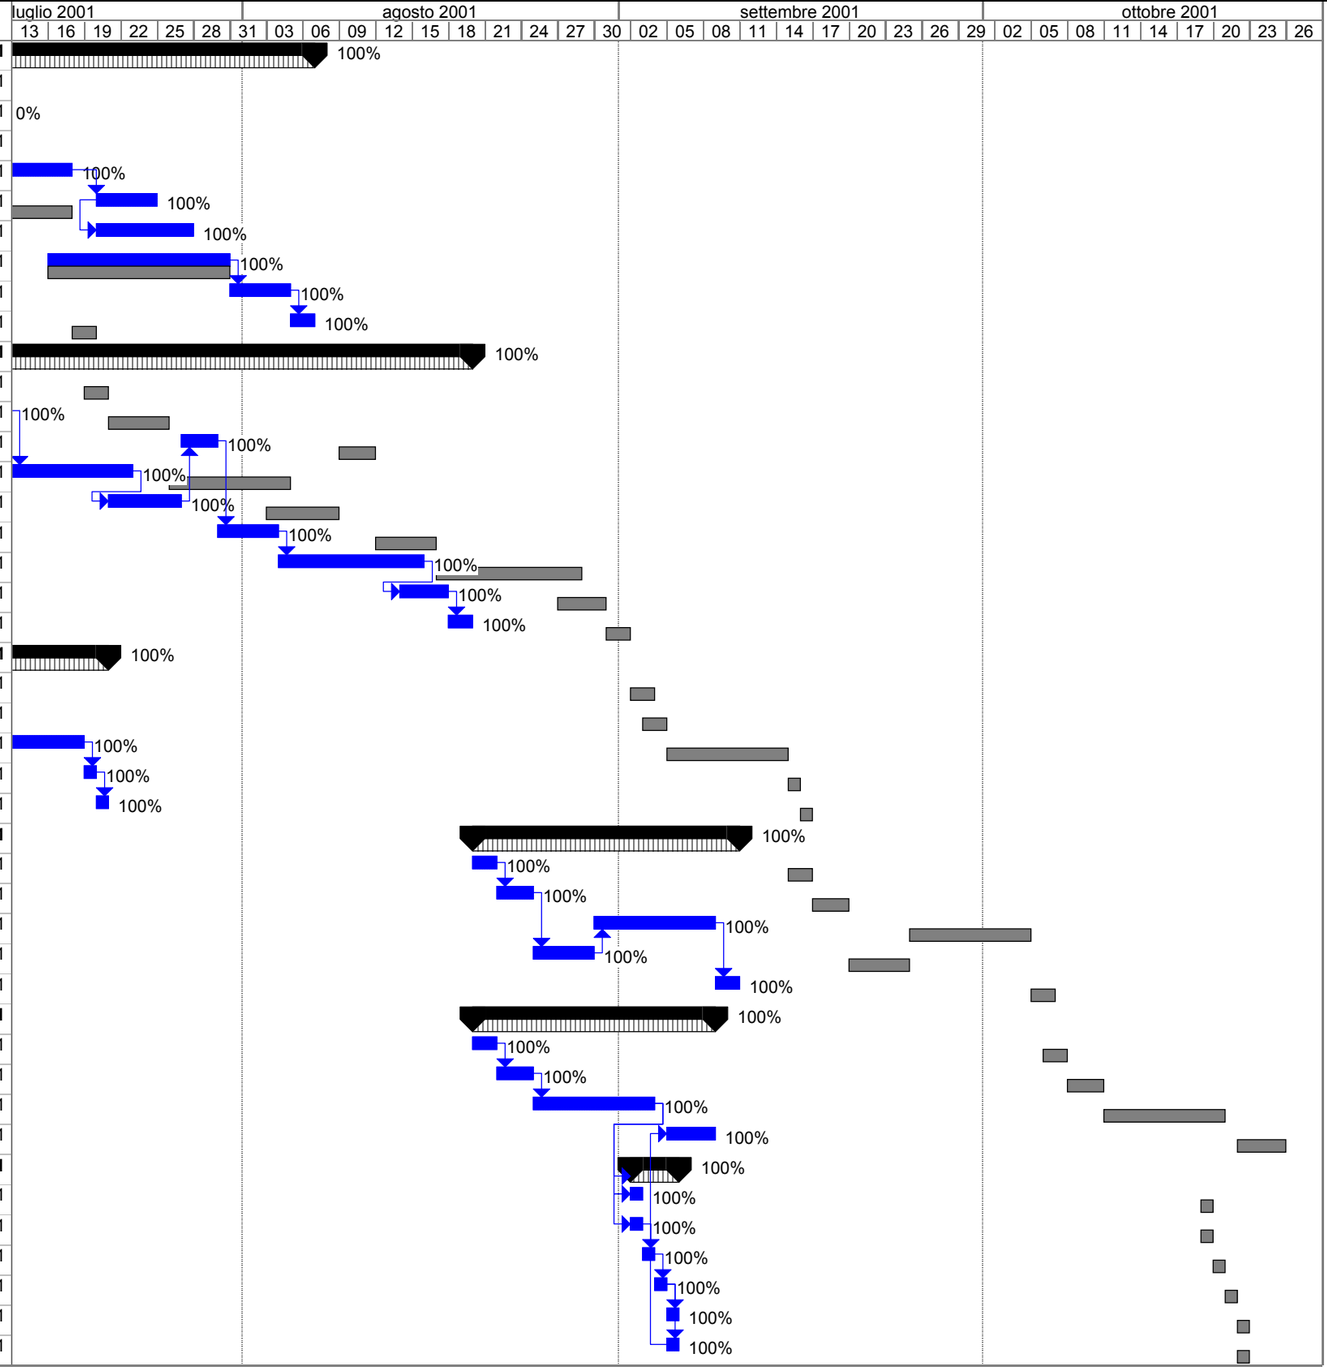

Progetto Complessivo - Dettaglio
Controllo al 15.X.2001
Data: ven. 19.10.2001

Critica	Divisione	Cardine previsto	Riepilogo progetto
Divisione critica	Avanzamento attività	Cardine	Attività esterne
Avanzamento critica	Previsto	Avanzamento riepilogo	Cardine esterno
Attività	Divisione prevista	Riepilogo	Scadenza

ID	Nome attività
1	**Lotto I stato 3**
1	**Area 1A 1B**
2	Impianto cantiere (A)
3	Impianto cantiere (B)
4	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A)
5	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (B)
6	Opere di scavo (B)
7	Opere di fondazione speciale (A)
8	Opere di fondazione speciale (B)
9	Opere di montaggio barriere pm
10	Opere in ca per strutture in elevato
11	Opere in ca per strutture in elevato
12	opere in muratura
13	Opere di sistemazione e regimazione acque
14	Opere di ripristino pavimentazione stradale
15	Rimozione cantiere
16	**Area 2/3B**
17	Impianto di cantiere
18	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
19	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste
20	Opere di fondazione speciale per barriere pm
21	Fornitura e posa barriere pm
22	Fornitura e posa di reti
23	Opere di fondazione in ca
24	Opere di sostegno in ca e muratura in elevato
25	Ripristino pavimentazione stradale
26	Ripristini acque superficiali di versante
27	Rimozione cantiere
28	**Area 4A**
29	Impianto cantiere
30	Tagli e disgaggi
31	Fondazioni speciali per barriere pm
32	Fornitura e posa barriere pm
33	Opere di scavo e demolizione
34	Opere di ca e muratura elevato
35	Fornitura e posa reti
36	Regimazione acque e rinverdimento
37	Ripristino pavimentazione stradale
38	Rimozione cantiere
2	**Lotto II stato 3**
1	**Area 5**
2	Impianto di cantiere
3	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
4	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste
5	Opere di fondazione speciale per barriere pm
6	Opere in legname
7	Fornitura e montagio barriere pm
8	Gradonate etc.
9	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
10	Rimozione cantiere
11	**Area 6-A**
12	Impianto di cantiere

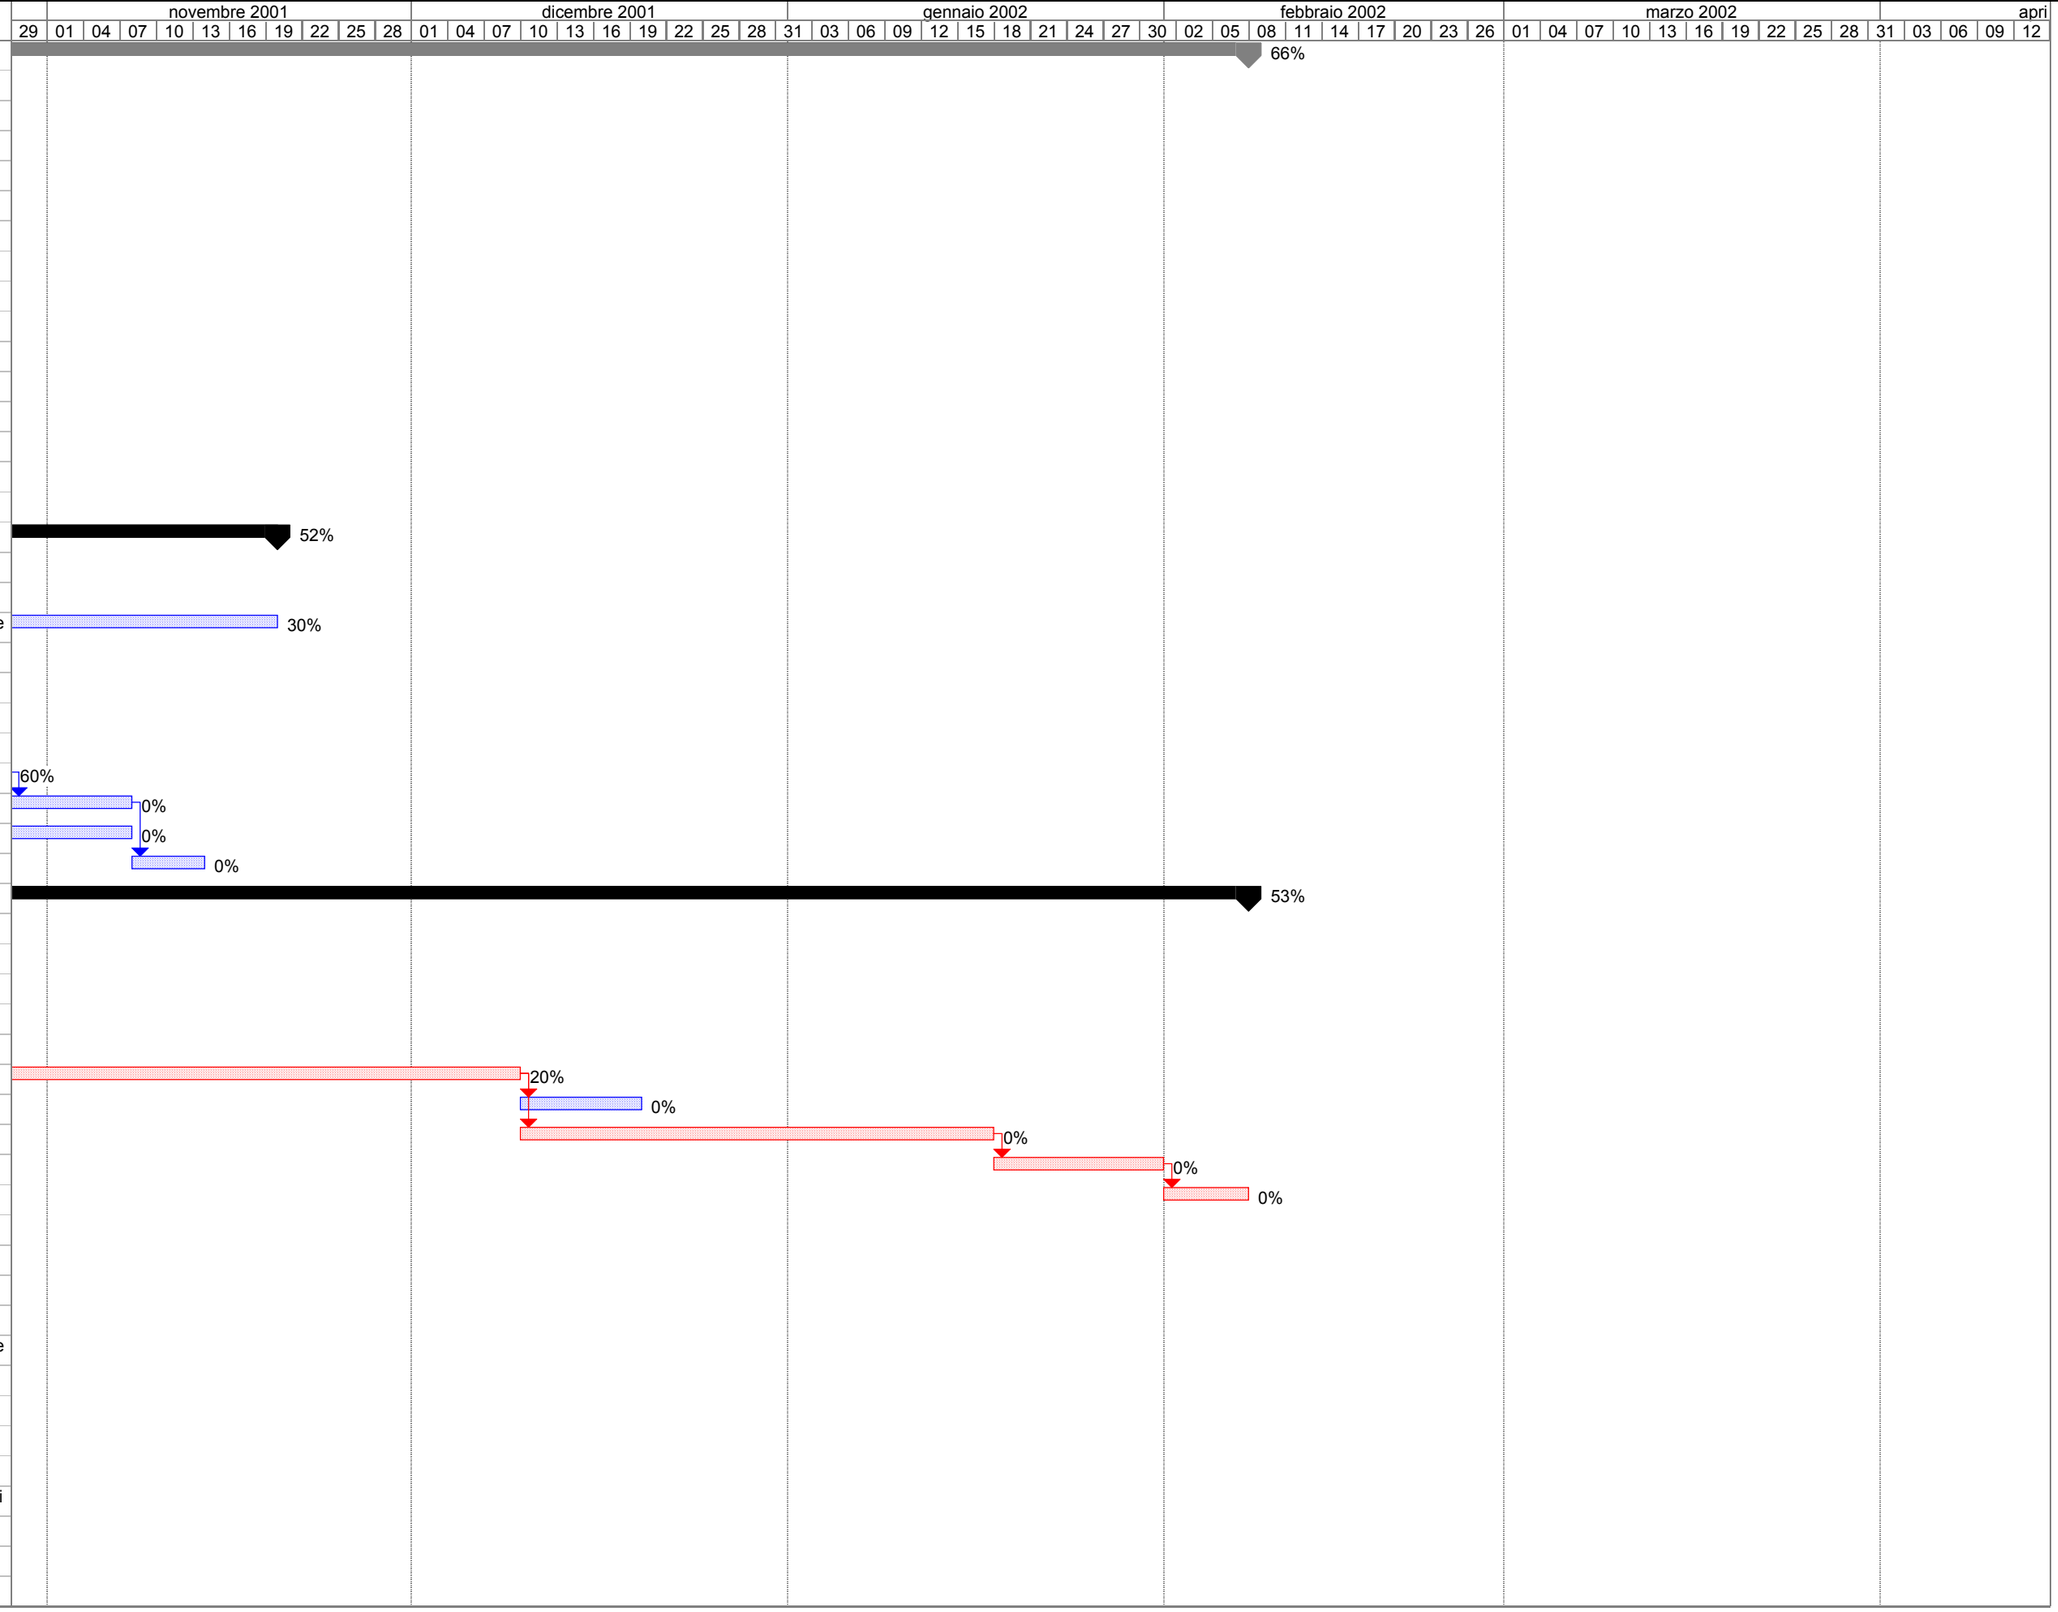

Progetto Complessivo - Dettaglio
Controllo al 15.X.2001
Data: ven. 19.10.2001

Critica		Divisione		Cardine previsto		Riepilogo progetto	
Divisione critica		Avanzamento attività		Cardine		Attività esterne	
Avanzamento critica		Previsto		Avanzamento riepilogo		Cardine esterno	
Attività		Divisione prevista		Riepilogo		Scadenza	

ID	Nome attività
13	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
14	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste
15	Reti e chiodature
16	Opere di fondazione in ca
17	Opere in muratura
18	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
19	Rimozione cantiere
20	**Area 6-B**
21	Impianto di cantiere
22	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
23	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste
24	Opere di fondazione speciale per barriere pm
25	Reti a contatto
26	Opere di montaggio barriere pm
27	Opere di sostegno in legname
28	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
29	Rimozione cantiere
30	**Area 6-C**
31	Impianto di cantiere
32	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
33	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste
34	Opere di fondazione speciale per barriere pm
35	Opere di montaggio barriere pm
36	Opere di fondazione in ca
37	Opere in muratura
38	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
39	Rimozione cantiere
40	**Area 6-D**
41	Impianto di cantiere
42	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
43	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di soste
44	Opere di fondazione in ca
45	Opere in muratura
46	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
47	Rimozione cantiere
48	**Area 6-E**
49	Impianto di cantiere
50	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
51	Opere di montaggio barriere pm
52	Opere di fondazione speciale
53	Reti e chiodature
54	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
55	Rimozione cantiere
56	**Area 6-G**
57	Impianto di cantiere
58	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
59	Reti e chiodature
60	Rimozione cantiere
61	**Ripristino pavimentazione Aree 5 e 6**
62	Area 5
63	Area 6-A
64	Area 6-B

Progetto Complessivo - Dettaglio
Controllo al 15.X.2001
Data: ven. 19.10.2001

Critica	Divisione	Cardine previsto	Riepilogo progetto
Divisione critica	Avanzamento attività	Cardine	Attività esterne
Avanzamento critica	Previsto	Avanzamento riepilogo	Cardine esterno
Attività	Divisione prevista	Riepilogo	Scadenza

ID	Nome attività
65	Area 6-C
66	Area 6-D
67	Area 6-E
68	Area 6-G
3	**Lotto III stato 3**
1	**Area 7A**
2	Impianto di cantiere
3	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
4	Opere di scavo
5	Opere di fondazione speciale
6	Reti e chiodature
7	Opere di montaggio barriere pm
8	Rimozione cantiere
9	**Area 7B**
10	Impianto di cantiere
11	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
12	Opere di scavo
13	Opere di fondazione speciale
14	Opere di montaggio barriere pm
15	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
16	Rimozione cantiere
17	**Area 7C**
18	Impianto di cantiere
19	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
20	Reti e chiodature
21	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
22	Rimozione cantiere
23	**Ripristino pavimentazione stradale Aree 7A-B-C**
24	Area 7A
25	Area 7B
26	Area 7C
27	**Area 7G-H**
28	Impianto di cantiere
29	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
30	Opere di scavo
31	Opere di fondazione speciale (A)
32	Opere di montaggio barriere pm
33	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
34	Ripristino pavimentazione stradale
35	Rimozione cantiere
36	**Area 9P-Q**
37	Impianto di cantiere (A+B)
38	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A+B)
39	Opere di scavo (B)
40	Opere di fondazione speciale (A)
41	Reti e chiodature
42	Opere di montaggio barriere pm
43	Opere di fondazione in c.a.
44	Opere in legname
45	Opere in muratura
46	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
47	Rimozione cantiere



Progetto Complessivo - Dettaglio
Controllo al 15.X.2001
Data: ven. 19.10.2001

Critica		Divisione		Cardine previsto		Riepilogo progetto	
Divisione critica		Avanzamento attività		Cardine		Attività esterne	
Avanzamento critica		Previsto		Avanzamento riepilogo		Cardine esterno	
Attività		Divisione prevista		Riepilogo		Scadenza	

ID	Nome attività
48	**Area 9R**
49	Impianto di cantiere
50	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
51	Opere di scavo (B)
52	Opere di fondazione speciale (A)
53	Reti e chiodature
54	Opere di montaggio barriere pm
55	Opere in muratura
56	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
57	Rimozione cantiere
58	**Area 9S**
59	Impianto di cantiere
60	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
61	Opere di scavo
62	Opere di fondazione speciale
63	Reti e chiodature
64	Opere di fondazione in ca
65	Opere in muratura
66	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
67	Rimozione cantiere
68	**Area 9T**
69	Impianto di cantiere (A+B)
70	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A+B)
71	Reti e chiodature
72	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
73	Rimozione cantiere
74	**Area 9U**
75	Impianto di cantiere
76	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
77	Reti e chiodature
78	Opere di sistemazione e regimazione acque dei
79	Rimozione cantiere
80	**Area 9V**
81	Impianto di cantiere
82	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
83	Reti e chiodature
84	Rimozione cantiere
85	**Ripristino pavimentazione stradale Area 9**
86	Area 9P-Q
87	Area 9R
88	Area 9S
89	Area 9T
90	Area 9U
91	Area 9V

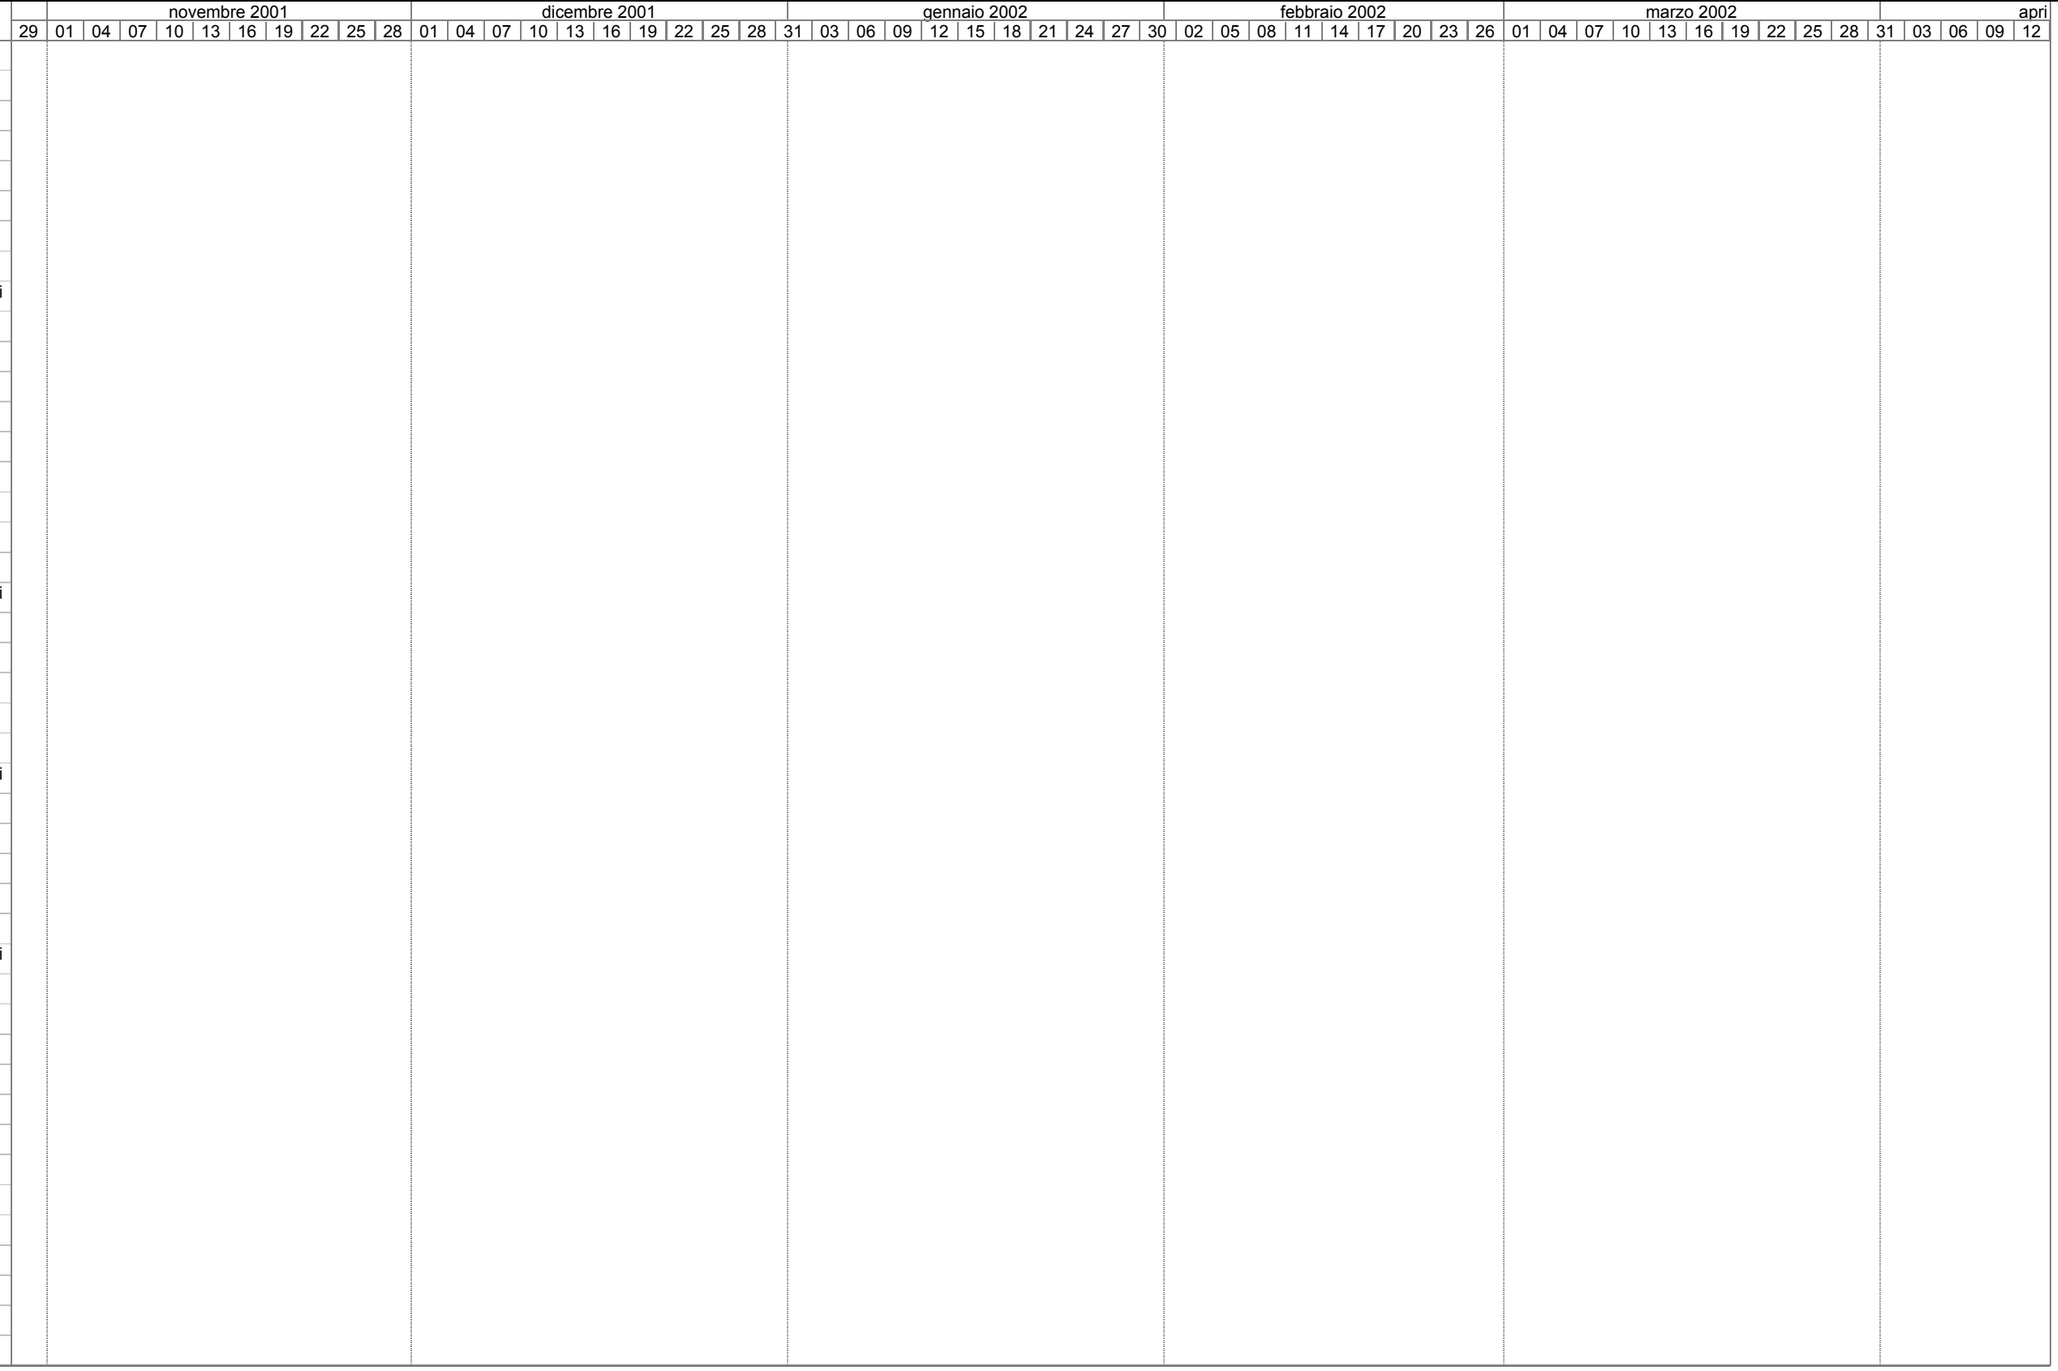

Progetto Complessivo - Dettaglio
Controllo al 15.X.2001
Data: ven. 19.10.2001

Critica	Divisione	Cardine previsto	Riepilogo progetto
Divisione critica	Avanzamento attività	Cardine	Attività esterne
Avanzamento critica	Previsto	Avanzamento riepilogo	Cardine esterno
Attività	Divisione prevista	Riepilogo	Scadenza
