ID	Nome attività
1	**Area 1A 1B**
2	Impianto cantiere (A)
3	Impianto cantiere (B)
4	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A)
5	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (B)
6	Opere di scavo (B)
7	Opere di fondazione speciale (A)
8	Opere di fondazione speciale (B)
9	Opere di montaggio barriere pm
10	Opere in ca per strutture in elevato
11	Opere in ca per strutture in elevato
12	opere in muratura
13	Opere di sistemazione e regimazione acque
14	Opere di ripristino pavimentazione stradale
15	Rimozione cantiere
16	**Area 2/3B**
17	Impianto di cantiere
18	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
19	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno
20	Opere di fondazione speciale per barriere pm
21	Fornitura e posa barriere pm
22	Fornitura e posa di reti
23	Opere di fondazione in ca
24	Opere di sostegno in ca e muratura in elevato
25	Ripristino pavimentazione stradale
26	Ripristini acque superficiali di versante
27	Rimozione cantiere
28	**Area 4A**
29	Impianto cantiere
30	Tagli e disgaggi
31	Fondazioni speciali per barriere pm
32	Fornitura e posa barriere pm
33	Opere di scavo e demolizione
34	Opere di ca e muratura elevato
35	Fornitura e posa reti
36	Regimazione acque e rinverdimento
37	Ripristino pavimentazione stradale
38	Rimozione cantiere

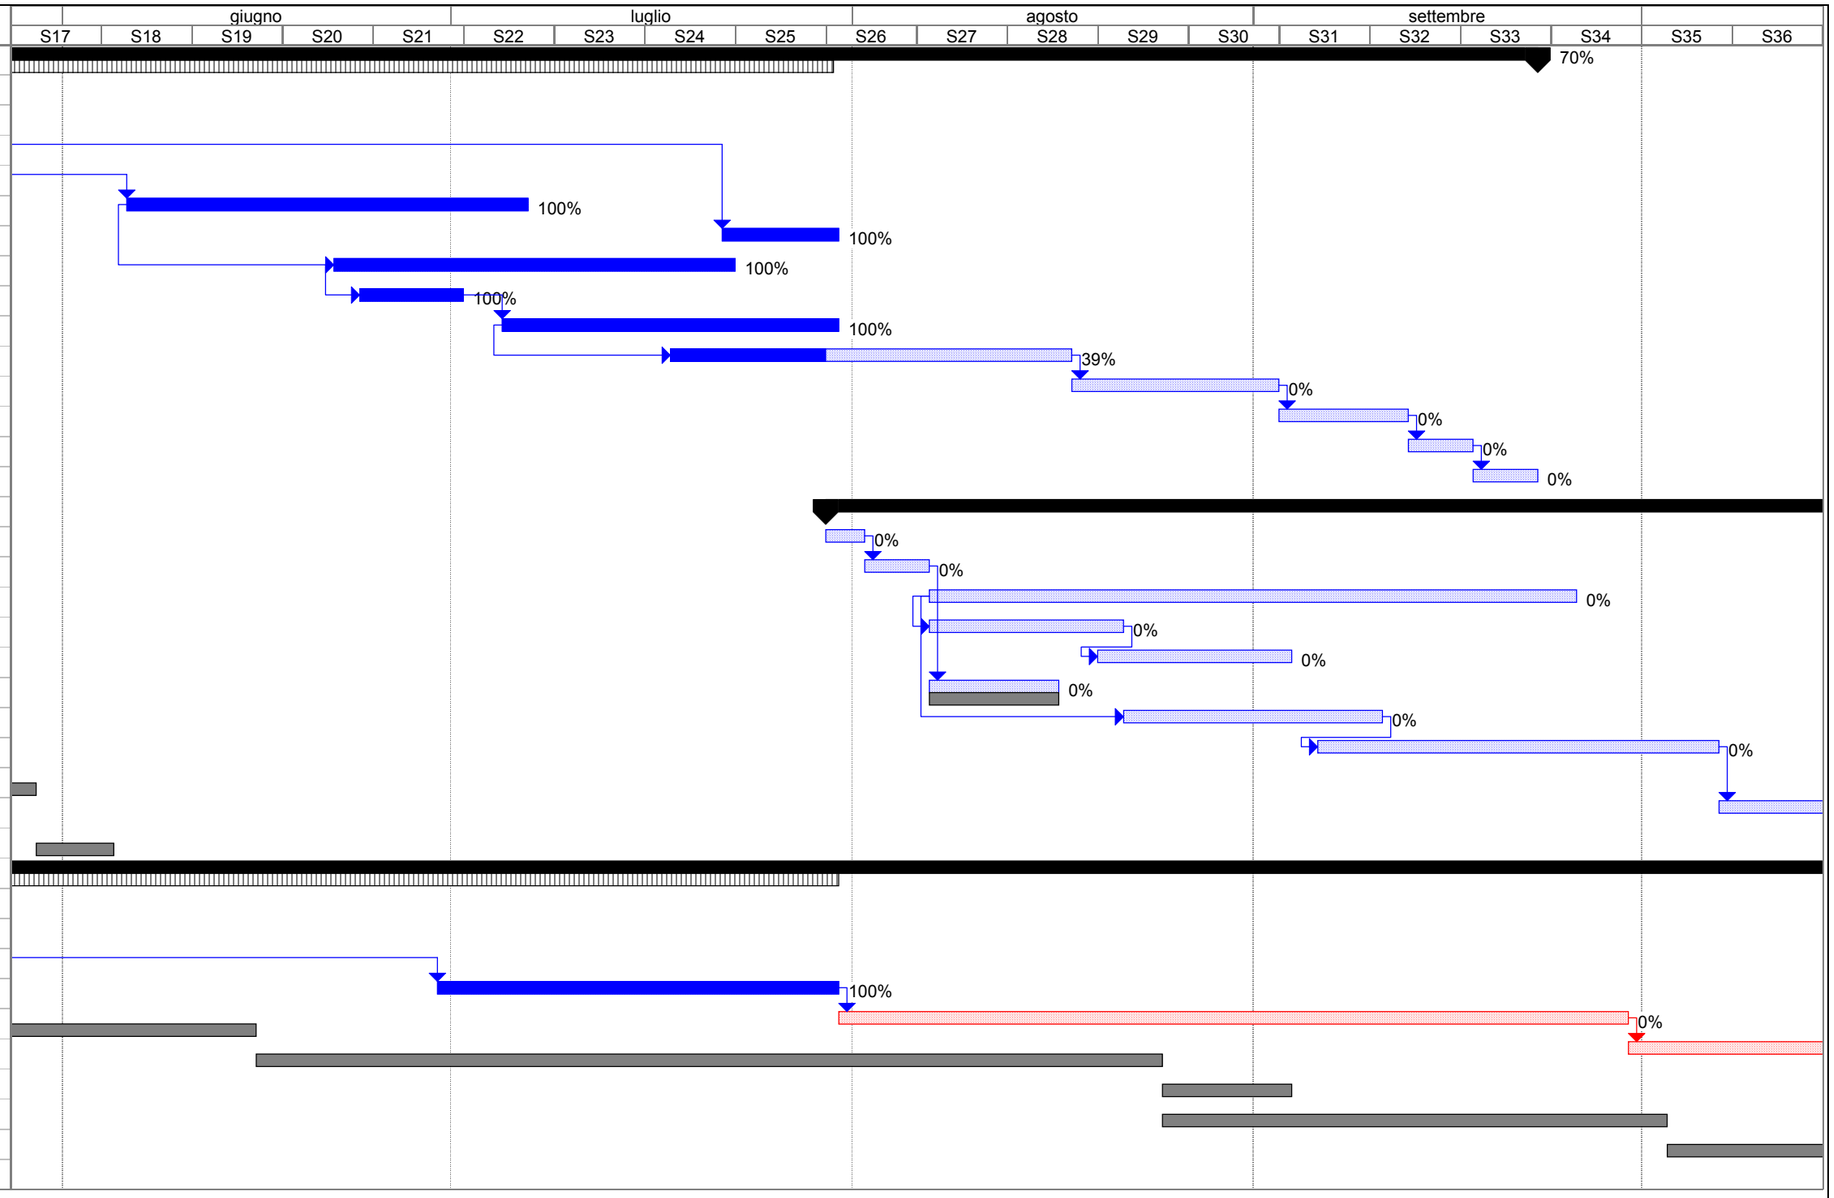

Progetto: Lotto I al controllo del 30.VII.2001
Data: ven 18/04/03

Critica		Divisione		Cardine previsto		Riepilogo progetto	
Divisione critica		Avanzamento attività		Cardine		Attività esterne	
Avanzamento critica		Previsto		Avanzamento riepilogo		Cardine esterno	
Attività		Divisione prevista		Riepilogo		Scadenza	

ID	Nome attività
1	**Area 1A 1B**
2	Impianto cantiere (A)
3	Impianto cantiere (B)
4	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A)
5	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (B)
6	Opere di scavo (B)
7	Opere di fondazione speciale (A)
8	Opere di fondazione speciale (B)
9	Opere di montaggio barriere pm
10	Opere in ca per strutture in elevato
11	Opere in ca per strutture in elevato
12	opere in muratura
13	Opere di sistemazione e regimazione acque
14	Opere di ripristino pavimentazione stradale
15	Rimozione cantiere
16	**Area 2/3B**
17	Impianto di cantiere
18	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
19	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno
20	Opere di fondazione speciale per barriere pm
21	Fornitura e posa barriere pm
22	Fornitura e posa di reti
23	Opere di fondazione in ca
24	Opere di sostegno in ca e muratura in elevato
25	Ripristino pavimentazione stradale
26	Ripristini acque superficiali di versante
27	Rimozione cantiere
28	**Area 4A**
29	Impianto cantiere
30	Tagli e disgaggi
31	Fondazioni speciali per barriere pm
32	Fornitura e posa barriere pm
33	Opere di scavo e demolizione
34	Opere di ca e muratura elevato
35	Fornitura e posa reti
36	Regimazione acque e rinverdimento
37	Ripristino pavimentazione stradale
38	Rimozione cantiere

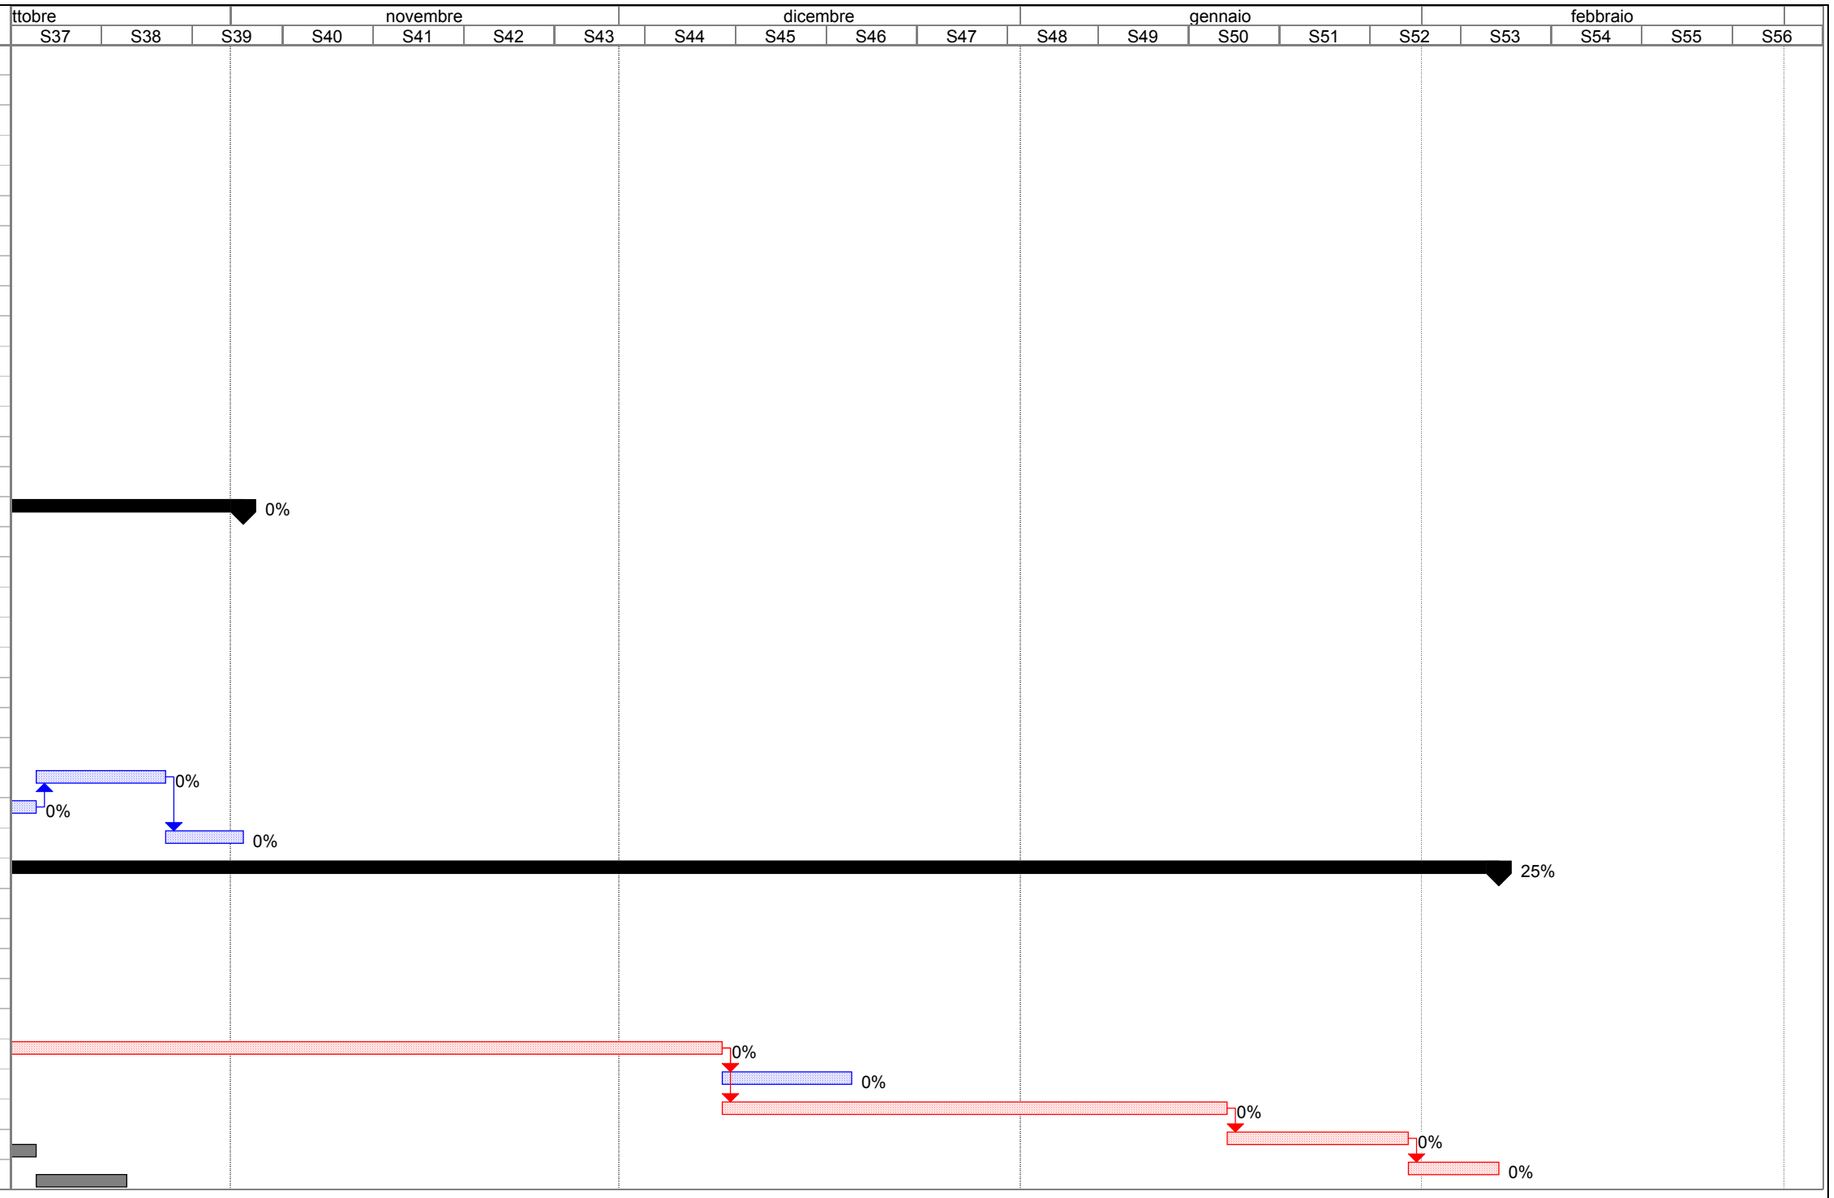

Progetto: Lotto I al controllo del 30.VII.2001
Data: ven 18/04/03

Critica		Divisione		Cardine previsto		Riepilogo progetto	
Divisione critica		Avanzamento attività		Cardine		Attività esterne	
Avanzamento critica		Previsto		Avanzamento riepilogo		Cardine esterno	
Attività		Divisione prevista		Riepilogo		Scadenza	
