ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**Area 1A 1B**	**243 g**	**gio 15/02/01**	**lun 15/10/01**
2	Impianto cantiere (A)	3 g	gio 15/02/01	sab 17/02/01
3	Impianto cantiere (B)	3 g	gio 15/02/01	sab 17/02/01
4	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A)	2 g	dom 18/02/01	lun 19/02/01
5	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (B)	2 g	dom 18/02/01	lun 19/02/01
6	Opere di scavo (B)	31 g	mer 06/06/01	ven 06/07/01
7	Opere di fondazione speciale (A)	9 g	dom 22/07/01	lun 30/07/01
8	Opere di fondazione speciale (B)	31 g	ven 22/06/01	dom 22/07/01
9	Opere di montaggio barriere pm	8 g	dom 24/06/01	dom 01/07/01
10	Opere in ca per strutture in elevato	26 g	gio 05/07/01	lun 30/07/01
11	Opere in ca per strutture in elevato	31 g	mer 18/07/01	ven 17/08/01
12	opere in muratura	16 g	sab 18/08/01	dom 02/09/01
13	Opere di sistemazione e regimazione acque	10 g	lun 03/09/01	mer 12/09/01
14	Opere di ripristino pavimentazione stradale	5 g	gio 13/09/01	lun 17/09/01
15	Rimozione cantiere	5 g	gio 11/10/01	lun 15/10/01
16	**Area 2/3B**	**113 g**	**lun 30/07/01**	**lun 19/11/01**
17	Impianto di cantiere	3 g	lun 30/07/01	mer 01/08/01
18	Opere di taglio vegetazione e disgaggi	5 g	gio 02/08/01	lun 06/08/01
19	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno	50 g	lun 01/10/01	lun 19/11/01
20	Opere di fondazione speciale per barriere pm	15 g	mar 07/08/01	mar 21/08/01
21	Fornitura e posa barriere pm	15 g	mar 09/10/01	mar 23/10/01
22	Fornitura e posa di reti	10 g	mar 09/10/01	gio 18/10/01
23	Opere di fondazione in ca	20 g	mer 22/08/01	lun 10/09/01
24	Opere di sostegno in ca e muratura in elevato	31 g	ven 28/09/01	dom 28/10/01
25	Ripristino pavimentazione stradale	10 g	lun 29/10/01	mer 07/11/01
26	Ripristini acque superficiali di versante	10 g	lun 29/10/01	mer 07/11/01
27	Rimozione cantiere	6 g	gio 08/11/01	mar 13/11/01
28	**Area 4A**	**358 g**	**gio 15/02/01**	**gio 07/02/02**
29	Impianto cantiere	3 g	gio 15/02/01	sab 17/02/01
30	Tagli e disgaggi	6 g	dom 18/02/01	ven 23/02/01
31	Fondazioni speciali per barriere pm	26 g	sab 24/02/01	mer 21/03/01
32	Fornitura e posa barriere pm	31 g	sab 30/06/01	lun 30/07/01
33	Opere di scavo e demolizione	61 g	mar 31/07/01	sab 29/09/01
34	Opere di ca e muratura elevato	70 g	lun 01/10/01	dom 09/12/01
35	Fornitura e posa reti	10 g	lun 10/12/01	mer 19/12/01
36	Regimazione acque e rinverdimento	39 g	lun 10/12/01	gio 17/01/02
37	Ripristino pavimentazione stradale	14 g	ven 18/01/02	gio 31/01/02
38	Rimozione cantiere	7 g	ven 01/02/02	gio 07/02/02

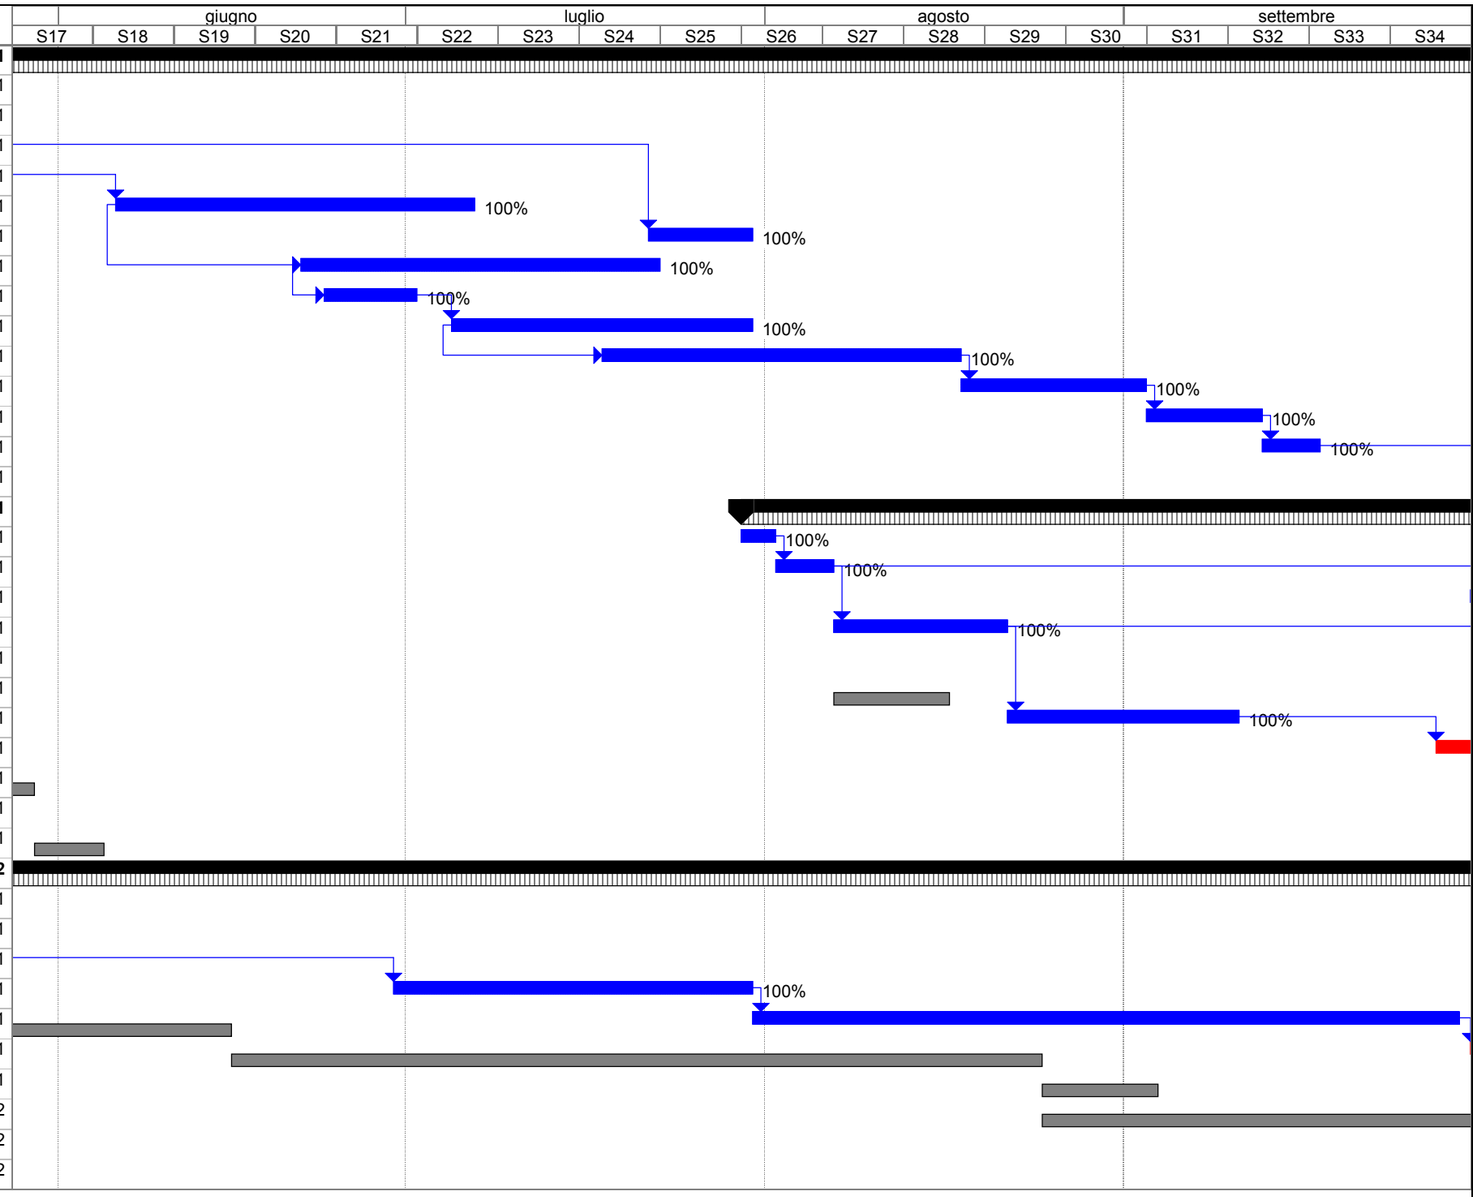

Progetto: Lotto I al controllo del 30.VII.2001
Data: ven 18/04/03

Critica		Divisione		Cardine previsto		Riepilogo progetto	
Divisione critica		Avanzamento attività		Cardine		Attività esterne	
Avanzamento critica		Previsto		Avanzamento riepilogo		Cardine esterno	
Attività		Divisione prevista		Riepilogo		Scadenza	

ID	Nome attività
1	**Area 1A 1B**
2	Impianto cantiere (A)
3	Impianto cantiere (B)
4	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (A)
5	Opere di taglio vegetazione e disgaggi (B)
6	Opere di scavo (B)
7	Opere di fondazione speciale (A)
8	Opere di fondazione speciale (B)
9	Opere di montaggio barriere pm
10	Opere in ca per strutture in elevato
11	Opere in ca per strutture in elevato
12	opere in muratura
13	Opere di sistemazione e regimazione acque
14	Opere di ripristino pavimentazione stradale
15	Rimozione cantiere
16	**Area 2/3B**
17	Impianto di cantiere
18	Opere di taglio vegetazione e disgaggi
19	Opere di scavo ing. Naturalistica + muri di sostegno
20	Opere di fondazione speciale per barriere pm
21	Fornitura e posa barriere pm
22	Fornitura e posa di reti
23	Opere di fondazione in ca
24	Opere di sostegno in ca e muratura in elevato
25	Ripristino pavimentazione stradale
26	Ripristini acque superficiali di versante
27	Rimozione cantiere
28	**Area 4A**
29	Impianto cantiere
30	Tagli e disgaggi
31	Fondazioni speciali per barriere pm
32	Fornitura e posa barriere pm
33	Opere di scavo e demolizione
34	Opere di ca e muratura elevato
35	Fornitura e posa reti
36	Regimazione acque e rinverdimento
37	Ripristino pavimentazione stradale
38	Rimozione cantiere

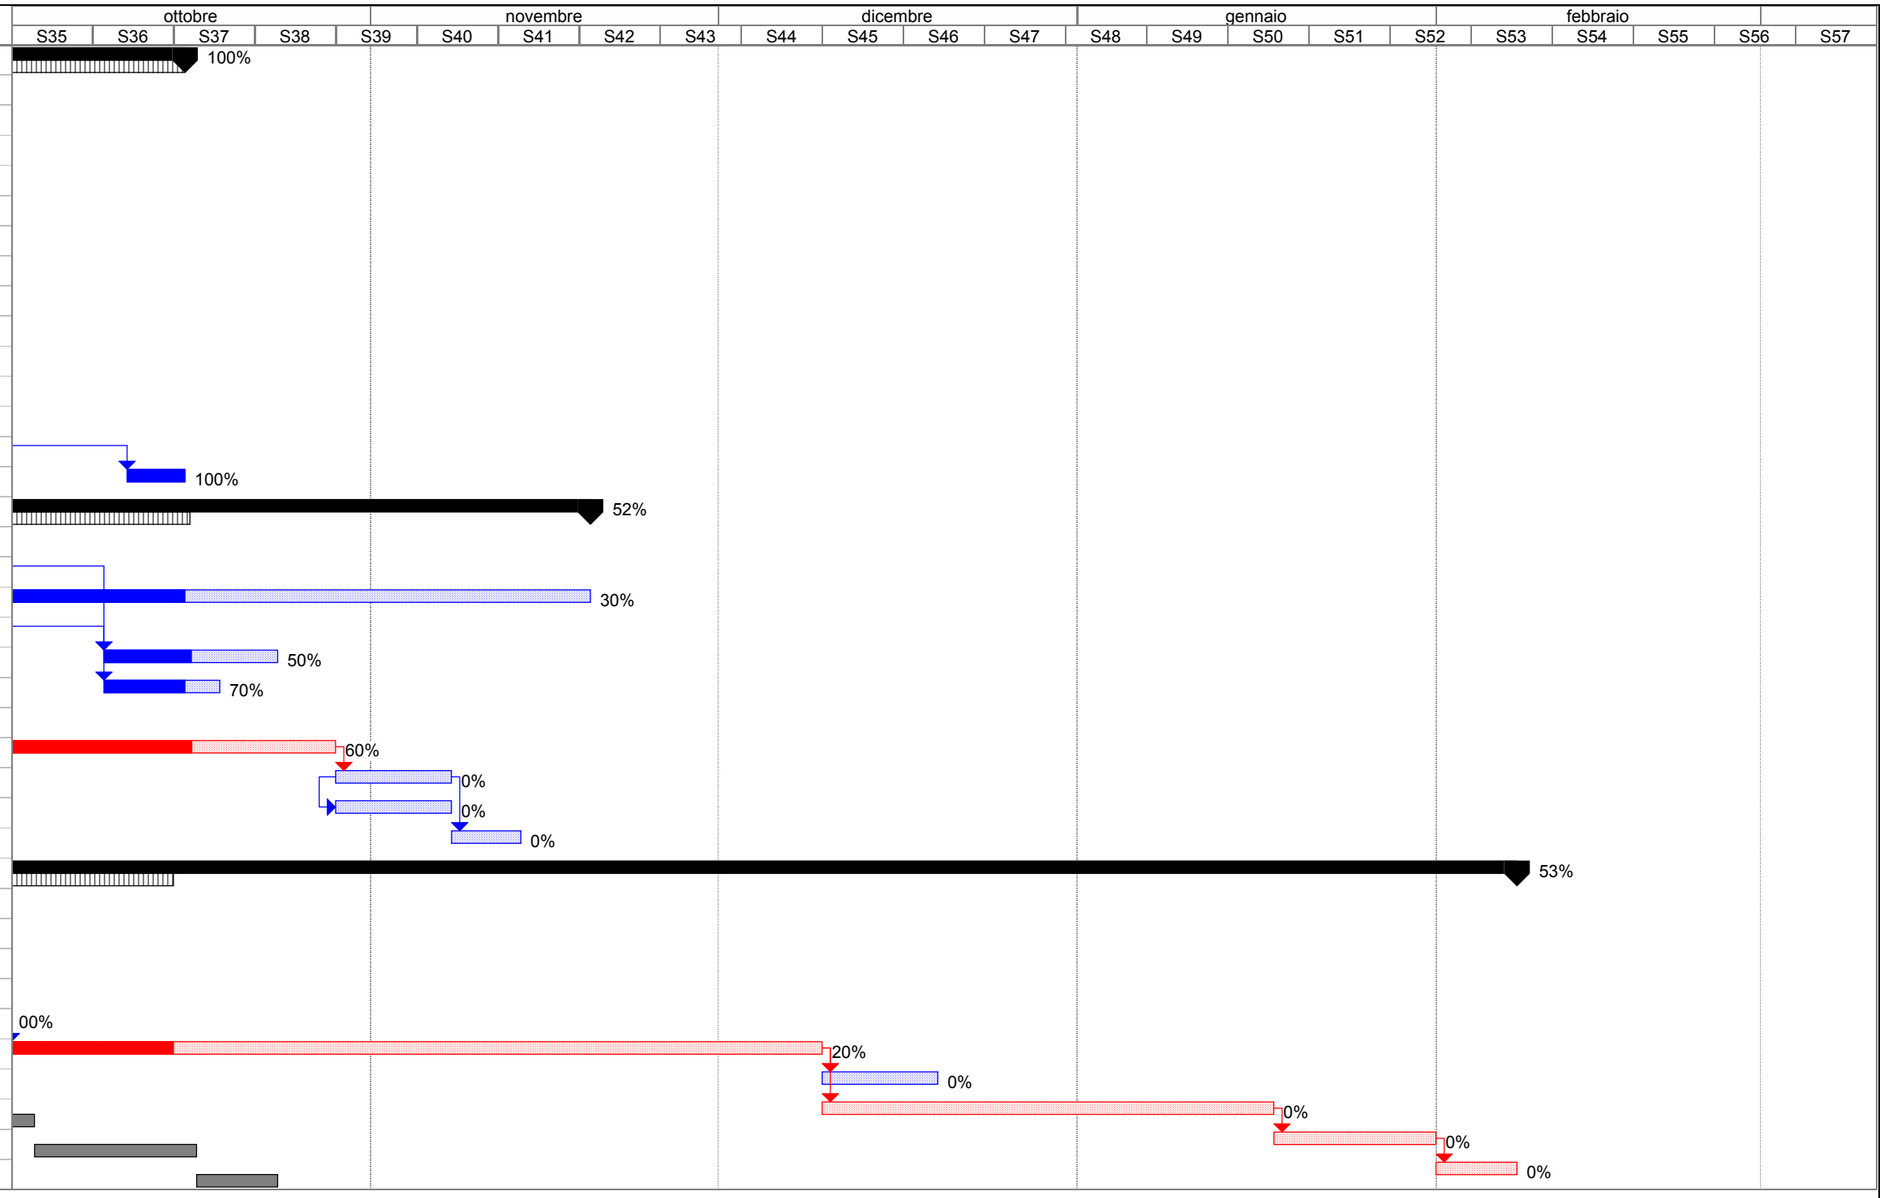

Progetto: Lotto I al controllo del 30.VII.2001
Data: ven 18/04/03

Critica		Divisione		Cardine previsto		Riepilogo progetto	
Divisione critica		Avanzamento attività		Cardine		Attività esterne	
Avanzamento critica		Previsto		Avanzamento riepilogo		Cardine esterno	
Attività		Divisione prevista		Riepilogo		Scadenza	
